

监 理 通 知 单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-07


致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事由：关于 1#生产车间支架底板和电缆桥架盖板安装问题事宜

内容：

1、配重基础部分预埋件螺杆存在质量问题，螺纹遭到破坏，螺母紧固安装困难，贵部施工人员私自采用焊接方式将支架底板与螺杆焊接，以此方式安装支架底板，不符合支架安装规范。

2、电缆桥架盖板安装直接采用扎丝绑扎，安装不牢固，极易松动，桥架密封不严实，缝隙较大；电缆桥架盖板安装前没通知业主方、监理方进行隐蔽工程验收，私自进行隐蔽。

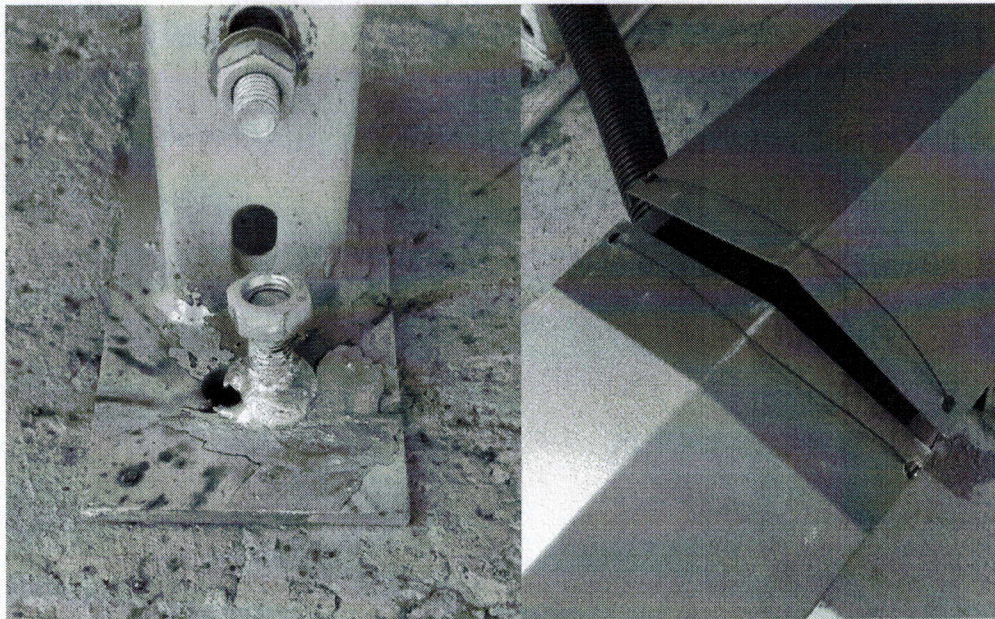

以上问题事宜要求贵部接此通知后立即整改，并报监理、业主验收。（三日之内回复）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：夏志兵

日期：2017 年 06 月 02 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
