

监理工程师通知单

工程名称：浙江嘉秀箱包制造有限公司分布式光伏发电项目

编号 ZJJX-TZD-001

致：嘉兴京禾光伏科技有限公司平湖项目部

主题：施工质量

内容：

2017年04月30日我监理人员在对浙江嘉秀箱包制造有限公司分布式光伏发电项目施工现场进行巡视时发现前期（2017年04月26日）提到的整改项（口头传达）：

1、支架檩条长短不一；（图1）

2、支架生锈；

3、支架连接处螺丝紧固不到位（图2）等仍未处理。现责令总包方尽快整改，以免影响后续工作。完成后先自检，合格后通知我监理部与建设方验收。通过后方可进行下道工序。



图1

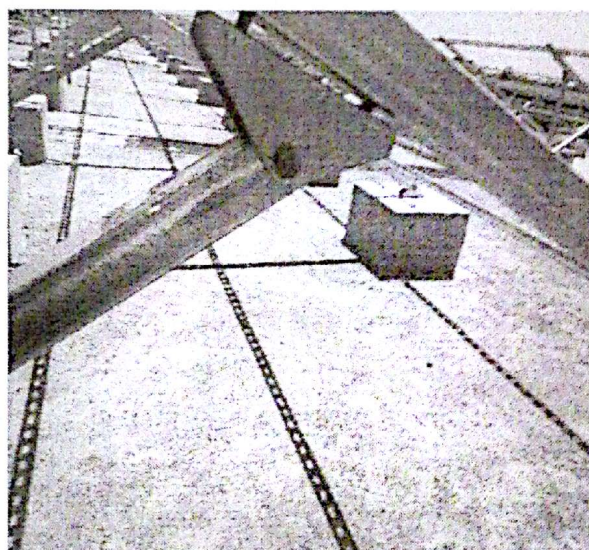


图2

限3日内整改完成！

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：2017.04.30

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建
