

监 理 通 知 单

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-01

致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及质量问题

- 1、现场组件堆放时部分搁置在中压块上，极易造成组件损坏，产生隐裂。
- 2、厂房屋面临边未设置安全防护，存在极大的安全隐患。
- 3、采光带未采取防护措施，无警戒标志。
- 4、临时爬梯未设置安全绳。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于三日内上报业主及监理验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵岩

日期：2017年6月16日



监 理 通 知 单

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-02




致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

- 1、现场组件堆放杂乱无章，容易造成组件损坏。
- 2、组件上随意堆放杂物。
- 3、现场施工人员踩板情况较多。
- 4、施工现场内杂物堆积较多。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于三日内上报业主及监理验收。

附图：

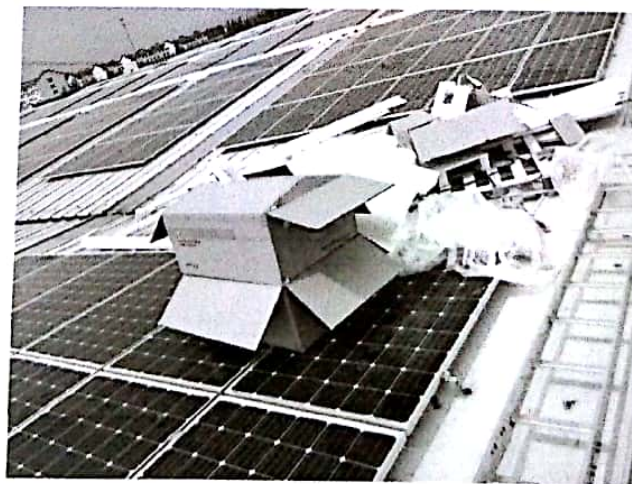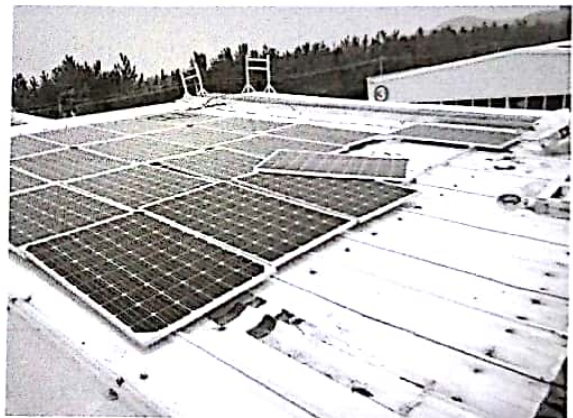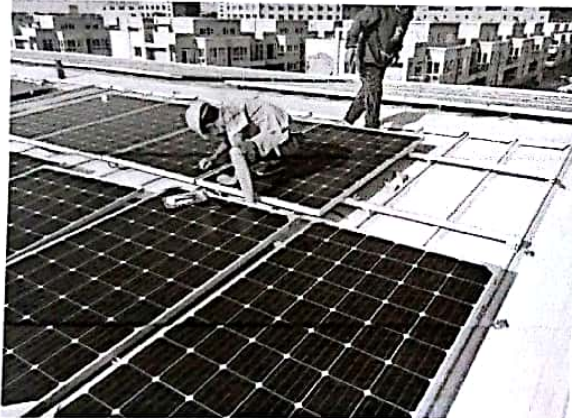

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵步良

日期：2017年6月20日

分布式光伏发电项目
监理单位

监 理 通 知 单

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-03

致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工质量问题

- 1、14号箱变并网运行后，箱体内部仍然有施工工人在进行接线作业，存在严重安全隐患。
- 2、个别并网运行后的箱变电缆管仍然未进行封堵，存在严重安全隐患。
- 3、天气预报预测今夜和明天有中到大雨，厂区西侧剩余的未开封的组件箱未进行覆盖防雨。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于明日上报业主及监理验收。

附图：



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2017年2月21日

徐州申鑫建材市场管理有限公司

分布式光伏发电项目

监理单位

监 理 通 知 单

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-04

致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

事由：由于前期抢 630，有部分项目逆变器、汇流箱接线压固不紧导致汇流箱、逆变器烧坏情况，为避免造成更大损失，现要求施工项目部组织人员对以下项目进行复查：

- 1、对汇流箱、逆变器线路接头进行全面复查，是否有压固不实发热现象。
- 2、对开路电压进行复查，对开路电压不符的及时进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：姜振

日期：2017年7月3日

监 理 通 知 单


工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-SXJC-05

致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目项目部

关于个别施工人员打赤膊施工事宜

内容

经监理现场巡查，发现个别施工人员在施工时打赤膊进行施工，现要求你项目部立即进行整改，整改后上报监理部进行复查。

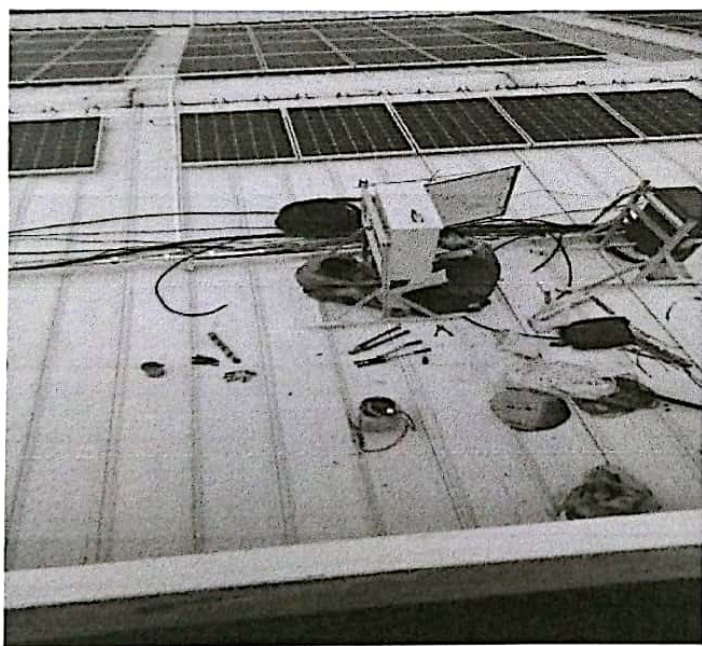

监 理 通 知 单


工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-06

致：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及质量问题

巡视发现 1#厂房西侧 3*150 电缆破损严重，电缆铠甲及内绝缘层破损，导致铜线外漏。现要求贵方即刻处理，出具整改措施，及时修补或更换电缆。整改后复查绝缘阻值并报监理项目部。请贵方及时处理，因处理不及时或处理不当造成的后果贵方负全部责任。

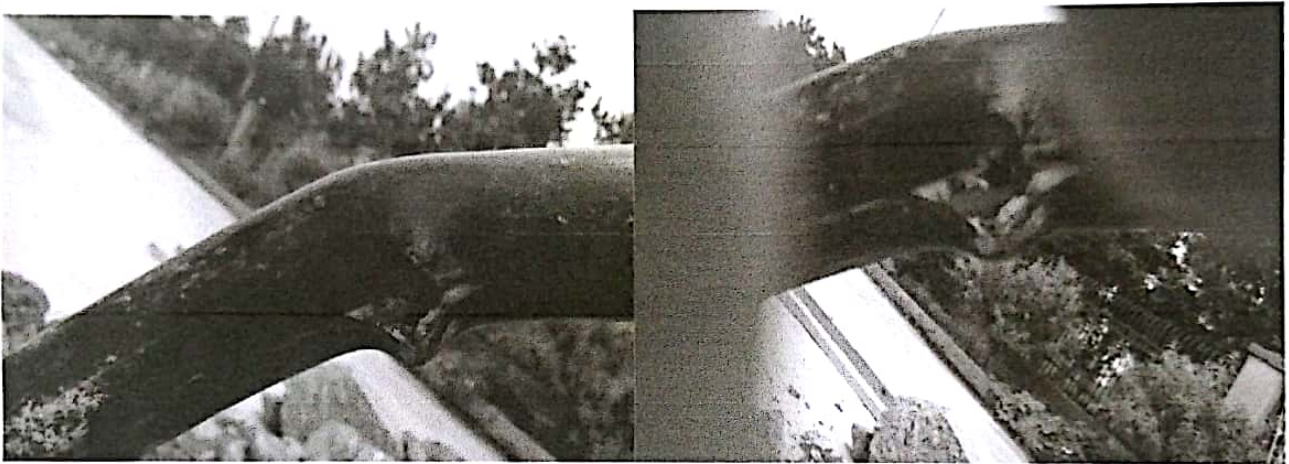

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王振

日期：2017年7月29日

徐州申鑫建材市场管理有限公司
分布式光伏电站项目
监理项目部
