

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-08


致：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工中现存的各项问题

- 1、由于采光带未采取任何防护措施，工人在施工中踩踏采光板，导致屋顶采光板损坏，具有很大的安全隐患且会使房屋漏水。
- 2、A5 区域直流电缆敷设过程中，施工人员直接将电缆由楼下拉扯至楼上，由于楼面非常粗糙，极易造成直流电缆损坏。
- 3、监理进场至今近一个月，但我方仍未收到你单位上报的任何施工报审资料 and 材料报审。
- 4、监理通知单已下达多份，但截至目前，我方仍未收到你单位监理通知回复单。
- 5、现场施工已全面展开许久，但我单位至今未见正式版施工蓝图，无根据无法对已完成工作进行验收。如需验收请提供相应的图纸依据，未经验收我方对此部位不承认质量合格。

以上问题望你单位及时处理，并将处理结果于明日下班前上报业主及监理验收。

附图：

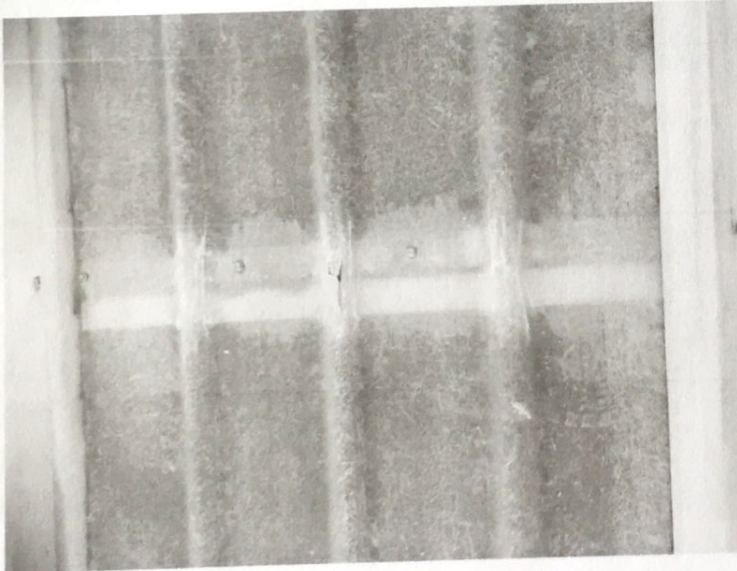

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵吉良

日期：2017年6月18日

徐州闽商石材市场管理有限公司
18MWp 分布式光伏电站项目
监理项目部
