

## 监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-17



致：徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于施工质量问题

- 1、混凝土支墩下侧用软沙土直接垫高，未用水泥砂浆找平，不符合规范及设计要求。
- 2、支墩四周混凝土配重不平整。
- 3、墩柱下防水垫层尺寸过小与图纸要求 80CM 不符，且防水垫层铺设在沙土上面，起不到防水效果。
- 4、C7 区域导轨夹具与彩钢瓦粘贴不牢导致脱落。
- 5、C6 区域逆变器直流电缆接线脱落。
- 6、至今未见混凝土支墩等混凝土复检报告。

7、至今未见任何前期及过程报审资料，我方已就此问题多次下发通知单催促，请贵方及时报审，未见报审前我方对贵方所完工工程质量不予承认验收。

就以上问题我监理方多次下过整改通知书，至今未见任何整改。望贵方及时整改后三日内报监理项目部验收，由于贵方整改不及时造成的后果，贵方负全部责任。

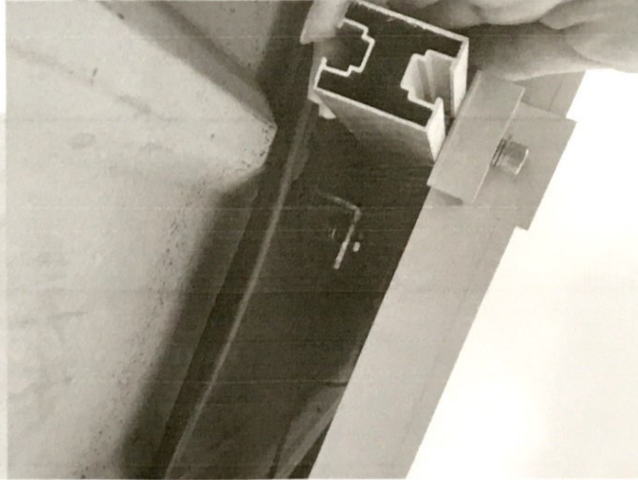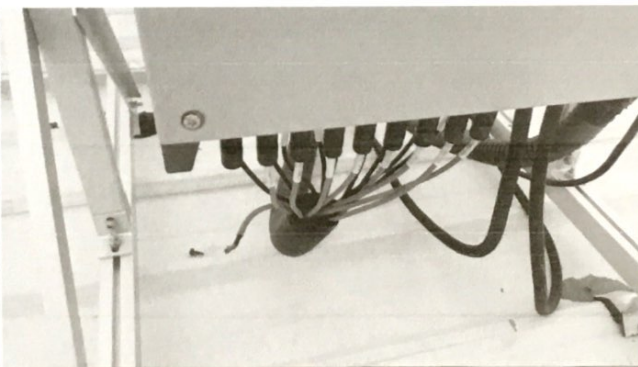

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年7月28日

