

监理工程师通知单

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：FNGF-JLTZD-08

致：常州天合光伏发电系统有限公司项目部

抄送：丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题：关于现场施工质量相关事宜

内容：

2018 年 10 月 29 日监理对黄旗镇西村（常州天合光伏发电系统有限公司总包单位）地块施工时进行巡检，发现以下质量问题：

- 1、之前巡查此地块打孔深度时发现孔深未达到设计要求（1700mm），现场监理要求施工单位整改并对其进行技术交底（现场无技术、管理人员），但未见整改。
- 2、混凝土浇筑时未向监理部报验，现已浇筑完成。
- 3、现已浇筑预埋件外露部分偏高，未达到设计要求（ $\pm 300\text{mm}$ ）。
- 4、部分桩基浇筑不垂直，偏差较大；个别桩距不符合设计要求。

针对以上问题，现要求常州天合光伏发电系统有限公司总包单位，管理人员做好现场技术交底，对浇筑时地块，派专人负责进行现场管控，严控施工质量及现场安全文明施工。另限期于 5 日内整改完成，否则对你单位进行经济考核。望总包单位悉知并重视。

附：不规范相片

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：2018.10.29



日 期：2018.10.29

监理项目部

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建

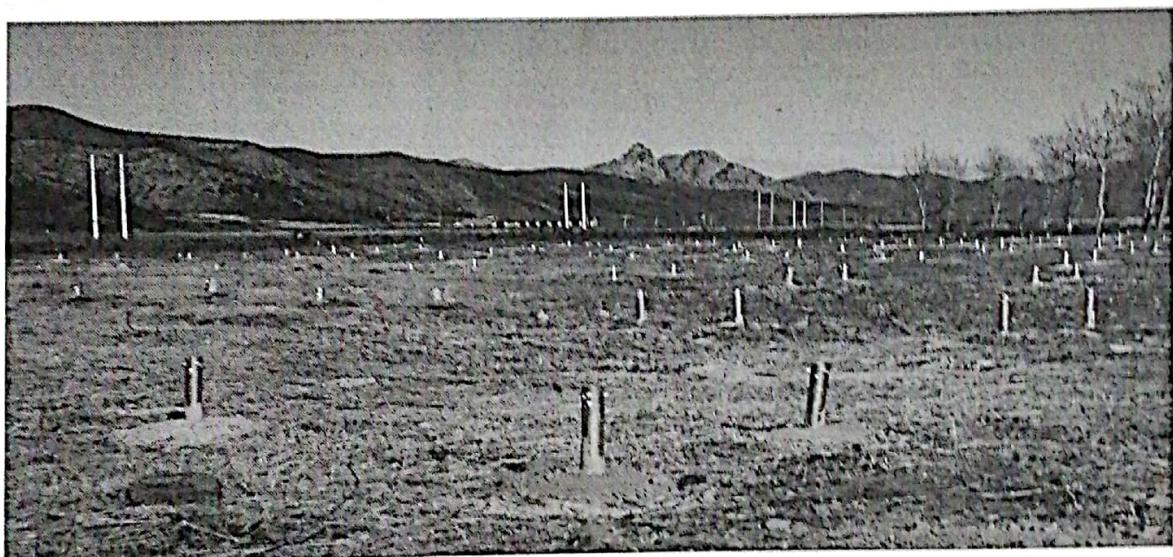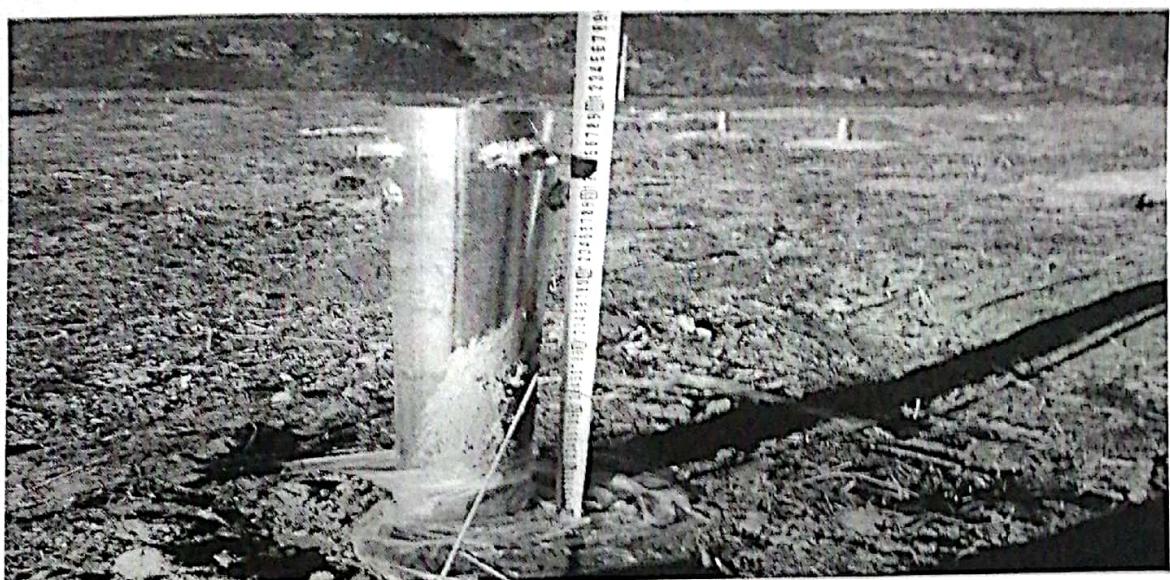

由 扫描全能王 扫描创建
