

监 理 通 知 单

工程名称：南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：GFDZJBM08-13

致：南瑞电力设计有限公司（总包方项目部）：

事由：关于 E01、E02、E04-E07 楼面光伏支墩浇筑整改施工楼面女儿墙安全防护问题。

内容：经监理项目部 2018 年 4 月 19 日对（南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54 子项目 E07 楼面检查）

发现存在以下质量问题：

- 1、E01、E02、E04-E07 楼面南北两端楼面女儿墙偏低（50cm）。
- 2、楼面施工人员用绳子往楼面吊运支墩模具（20mm*50mm），存在重大安全隐患。
- 3、楼面施工整改人员支墩浇筑模具制作、砂浆转运在较低的女儿墙处操作及走动，易出现施工人员掉落下楼面的危险。

要求：

- 1、总承包方项目负责人应尽快安排 E01、E02、E04-E07 楼面南北两端楼面女儿墙低于（50cm）进行安全防护。
- 2、防护围挡完成后通知监理项目部检查验收。
- 3、对 E01、E02、E04-E07 楼面南北两端楼面女儿墙偏低（50cm）未做安全防护，严禁楼面施工。
- 4、如私自楼面施工，出现施工整改人员人身安全事故，由总承包方负全责。

附：质量问题图片


监理单位（章）

总监理工程师：程明

日期：2018 年 4 月 20 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。



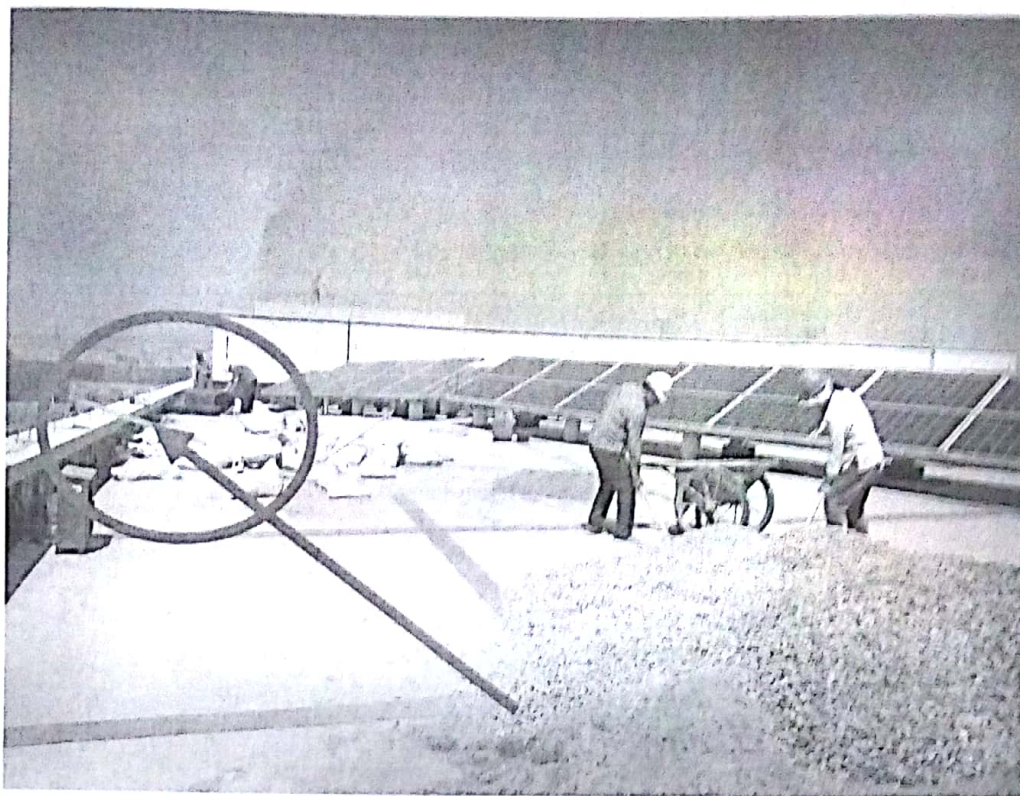

E07 楼面女儿墙偏低、支墩模具制作人员楼面边沿制作模具

