

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-001

致: 北京中伏源能源科技有限公司 (施工项目部)

事由:

关于哈里哈乡莫里莫村现场存在的需整改问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目现场存在较多质量问题, 具体问题见附件。

要求你单位立即安排人进行整改, 整改完成后拍照回复并通知监理复查。

本通知单要求贵单位在 5 个工作日内进行回复。

附件共 2 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李


日期: 2017 年 08 月 24 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。

哈里哈乡莫里莫村现场问题：



同一阵列区光组件板之间不齐整

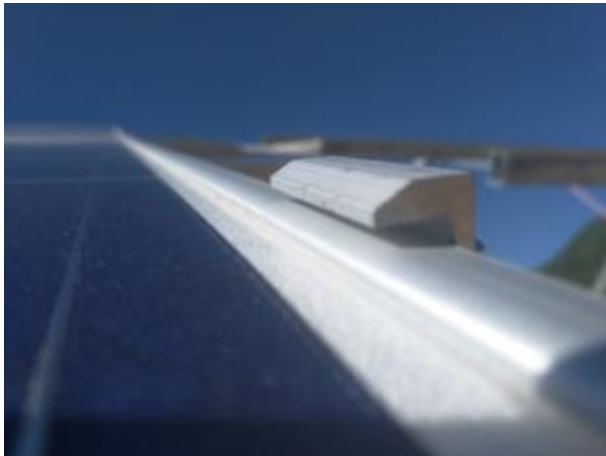

边压块安装不符合要求（未压靠、歪斜）



立柱上抱箍的螺母未使用热镀锌已生锈、未加垫片和弹垫



接地扁铁焊接区过短、焊接前焊渣未清理



组件板面上有划痕、防水皮套安装位置错误



防孤岛箱下洞口未封堵，接线混乱
