

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-007

致: 江苏润海环保工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于石桌子乡盖子沟村现场存在的需整改问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目现场存在以下问题:

- 1、部分垫片未使用热镀锌已生锈;
- 2、部分组件压块安装不规范;
- 3、部分螺栓安装不规范或缺少垫片弹垫;
- 4、部分汇流箱、逆变箱进线套管偏短, 不齐整;
- 5、接地扁铁焊接长度不够, 未刷防腐;
- 6、部分阵列间穿线套管长度不够或未固定;
- 7、计量箱内洞口封堵不规范;

要求你单位立即安排人进行整改, 整改完成后拍照回复并通知监理复查。

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 2 页


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 09 月 01 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。


石桌子乡盖子沟村现场问题：

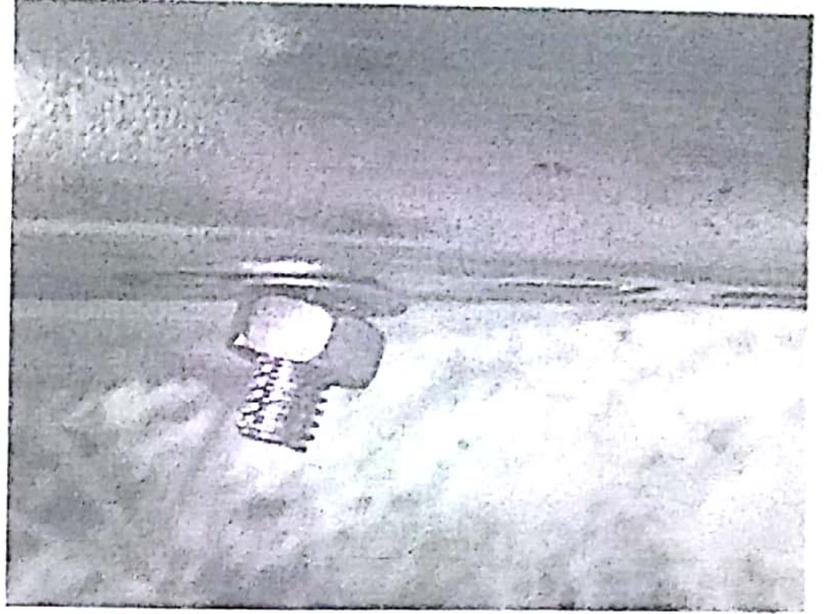

部分螺栓缺安装不规范、缺少垫片和弹垫




接地焊接区长度不够、未刷防腐

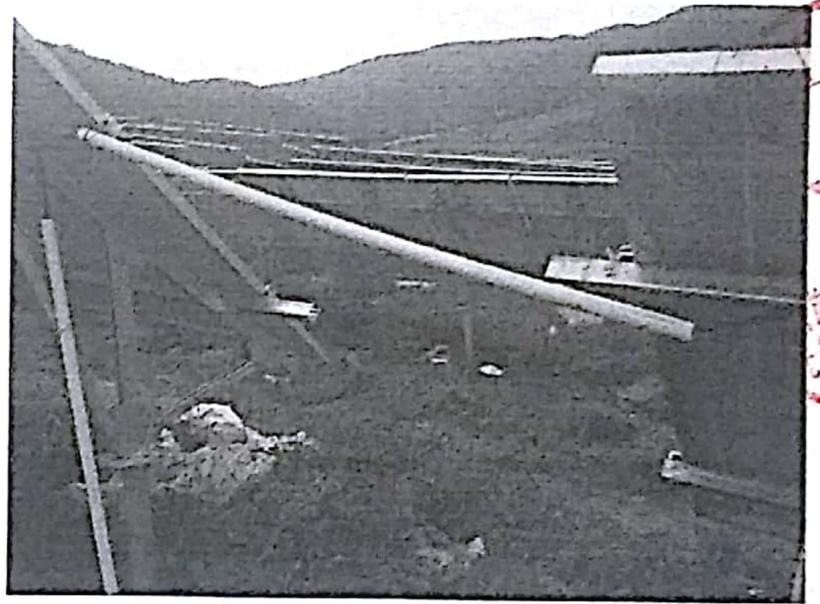

阵列间穿线套管未固定



垫片生锈

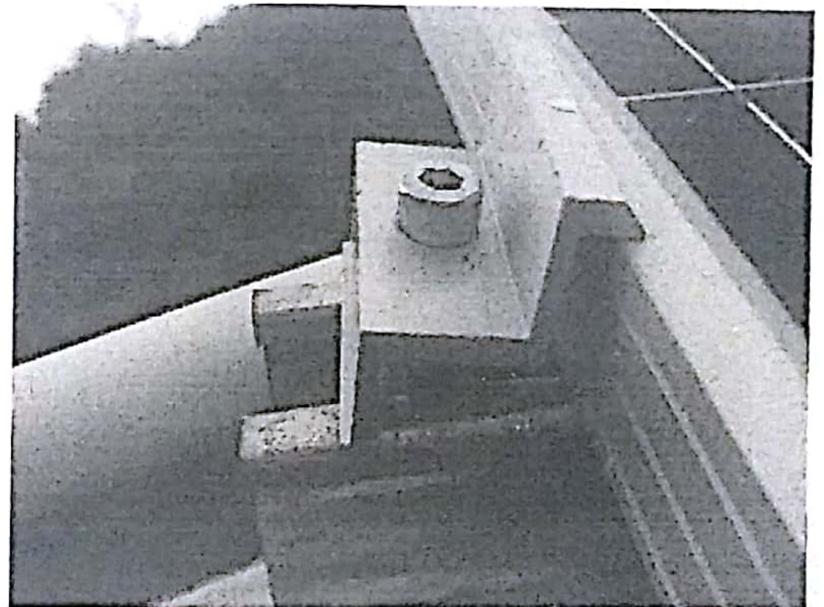

压块安装不规范





汇流箱下套管过短



箱内洞口封堵不规范

公司
日期
