

监 理 通 知 单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HXFP-004


致：马鞍山力泉电气安装有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区支架、组件安装存在的问题

内容：现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

- 1、乌江新圩场地光伏支架斜撑、拉撑未安装完成，急于开始安装光伏组件。
- 2、乌江中学场地光伏组件边压块安装不符合要求，严重影响工程后期质量。

附：问题照片

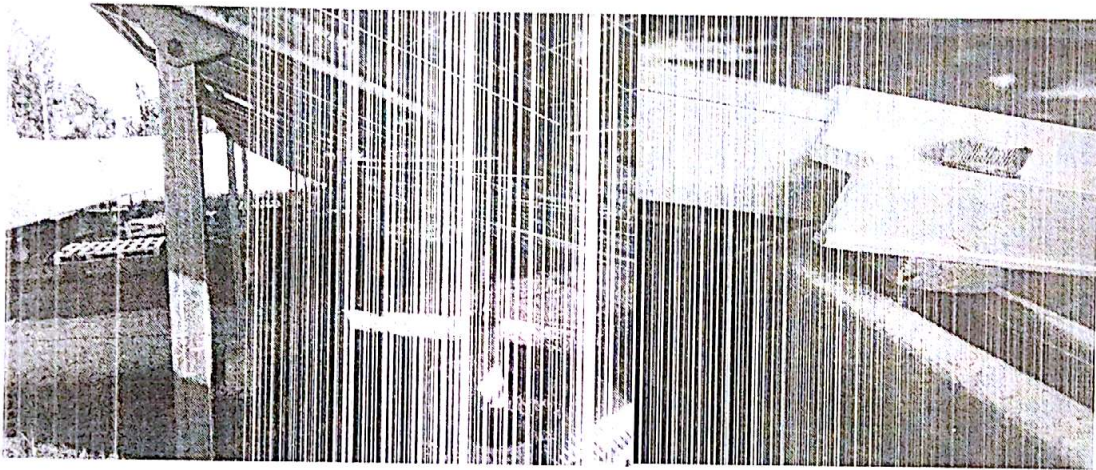

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 3 日内整改，报监理及业主单位验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 9 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目



编号：ZHJL-HXFP-004H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-HXFP-004 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

- 1、我方已严格按照施工要求安装光伏支架斜撑、拉撑。
- 2、我方已对边压块安装不符合要求的地方进行整改。

附：整改照片

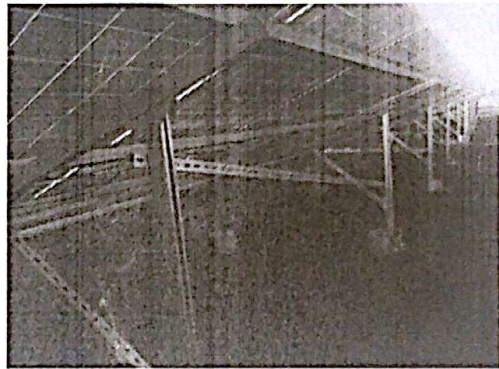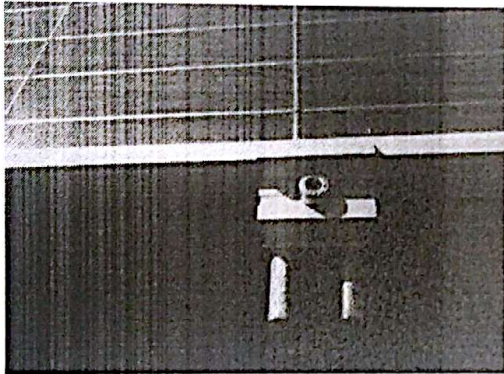

施工项目部（盖章）：

施工负责人（签字）：陈永金

日期：2017.8.14



复查意见：

经审查，已整改完成

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：赵斌

日期：2017.9.12



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
