

监 理 通 知 单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HXFP-006



致：马鞍山力泉电气安装有限公司施工项目部：


事由：关于光伏区逆变器、汇流箱、计量柜接线存在的问题

内容：现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

- 1、逆变器接线时，下方电缆套管未做封堵处理。
- 2、汇流箱进线口存在现场加工，造成进线口过大，未对电缆进行保护措施。
- 3、计量柜下方交流电缆固定存在安全隐患，未对电缆做套管处理，未安装设计要求进行施工。
- 4、乌江中学、香泉等场地的电缆沟深度达不到设计要求。

附：问题照片

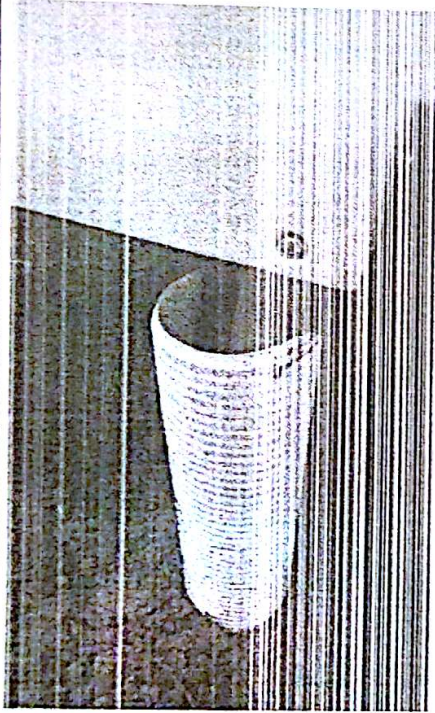

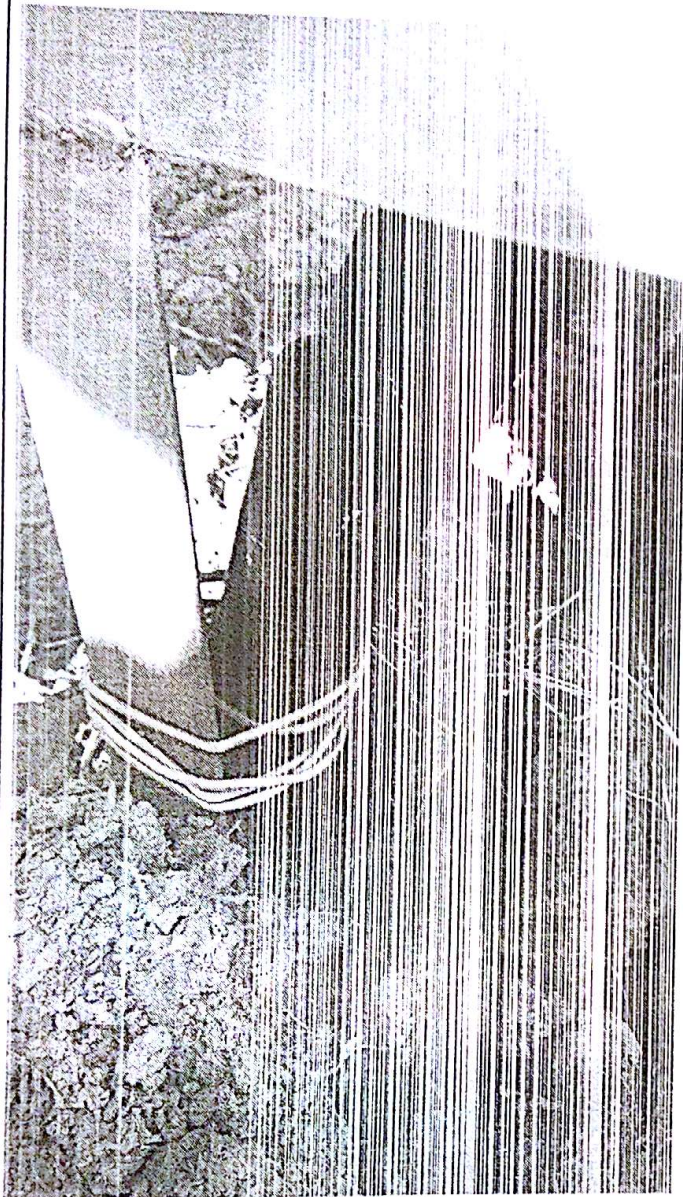

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 3 日内整改，报监理及业主单位验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 9 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


监理通知回复单

工程名称：和县 31 户户联建光伏扶贫电站项目
编号：ZHJL-HXFP-006H
致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-HXFP-006 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

- 1、按照要求，对电缆套管进行封堵处理。
- 2、按照要求，对电缆进行口过大的，进行补充、封堵处理。
- 3、按照要求，对电缆进行套管处理，并进行固定、保护。
- 4、按照要求，保证电缆沟的深度。

附：整改照片

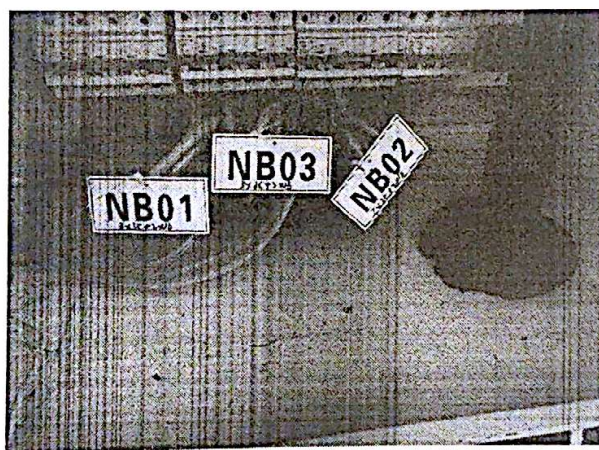

施工项目部（盖章）：

施工负责人（签字）：陈永全

日期：2017.9.19

复查意见：

经查，已整改完成

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：赵斌

日期：2017.9.19

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
