

监理通知单

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：007

致：甘肃海霖电力工程有限公司

事由：安全及质量问题

内容：2017年10月27日施工现场各屋面各施工工作全面展开，也同时出现了一些问题，好的方面施工现场各工序有了明显进展，问题方面主要有以下几点。


1、施工现场管理人员较少，施工程序安排不到位各施工小组不能有效配合（如组件固定好后背面C4插头未取开连接，后期还需要取开连接，且组件距屋面距离较近下步不好施工造成窝工）

2、未做好新进员工的安全交底及技术交底，巡视发现个别工人踩踏采光带安全意识低，施工人员对所施工部位注意事项不理解。

3、吊装至屋面支架及组件分散不及时（易造成压坏屋面等安全隐患，每天所吊装的材料必须第一时间分散）。

4、现场屋面随处可见组件保护边角料（下步施工必须开箱后现场清理边角料禁止带至各分散区域，清理不及时易堵塞屋面下水口，每日所产生的废料必须当天清理干净）

5、屋面采光带未做有效安全防护，施工紧张屋面人员较多，需及时做好安全防护铺设施工通道。

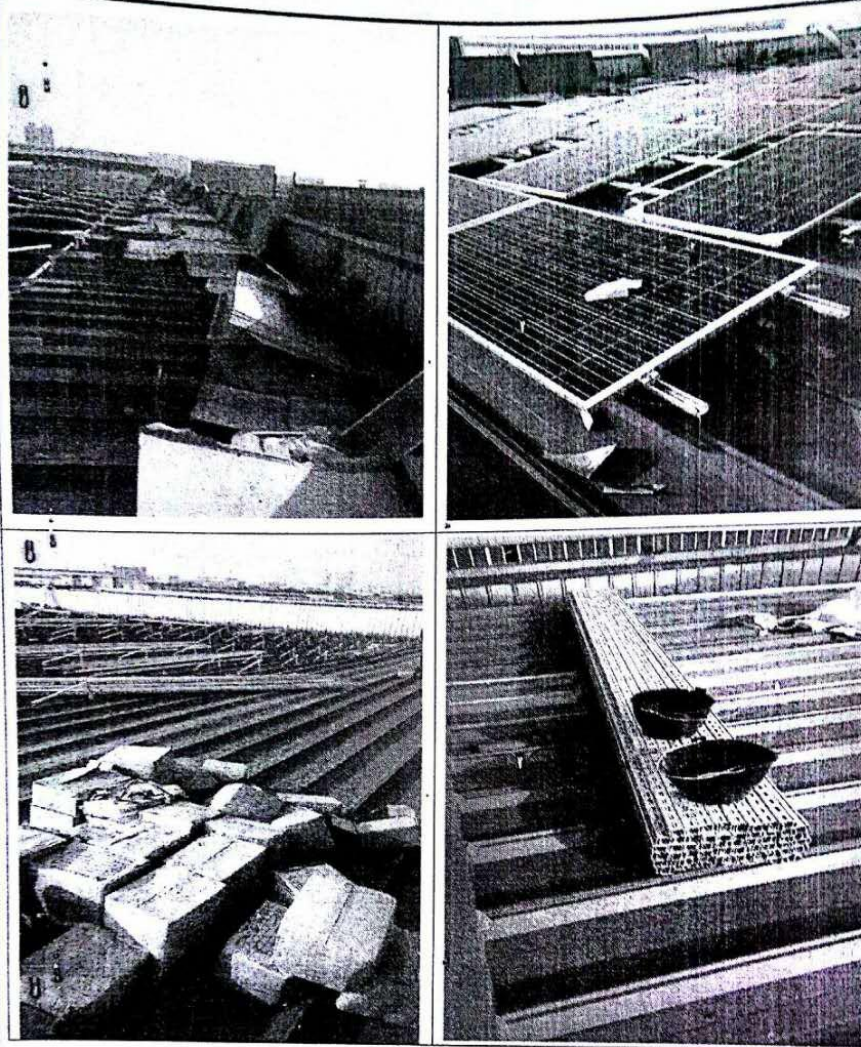

针对以上问题请贵方明日整改完毕，做好下步施工方案，明确各施工程序负责人，如因你方疏忽造成不必要的损失你方全责。

总/专业监理工程师

日期：2014年10月24日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。
