

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称： 东源天华阳光农光互补 100MW 项目


编号： 010#

致： 江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部；

事由： 关于前 27.6MW 地块箱变基础内渗水事宜；

内容： 在今天上午进行专项检查中发现发现 27.6MW 箱变基础因电缆进出孔洞封堵不严密，造成箱变基础内因下雨导致普遍积水，积水达 10CM-30CM，给箱变运行环境带来安全隐患。

- 要求：**
- 1) 施工单位应把所有箱变基础内的积水抽干，两日内完成，完成后报我部复查。
 - 2) 将预留 洞口剔除重新堵洞，洞内电缆线居中封堵，电缆线不得贴边，防止渗水，箱变基础内应保持干燥、无积水状态。
 - 3) 根据设计图纸编制整改进度计划表（包括检修平台）报我部审核。积水情况如下图：

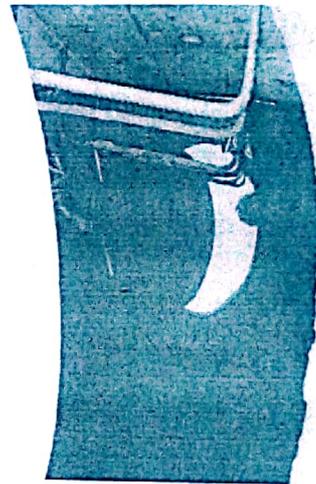

监理单位



监理项目部（盖章）
 专监工程师（签字） *董永红*
 日期 2018.3.20

总包单位签收



总包单位（盖章）
 项目负责人（签字） *丁绍军*
 日期 2018.03.21

本表一式 三 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 一 份

