

通知单

工程名称：益阳大通湖 200MWp 东大渔光互补发电项目


编号：002

致：中国电建集团江西省火电建设公司二期项目部

事由：关于施工现场光伏基础管桩施工的质量问题

内容：预收购单位人员在巡检过程中发现，58 区施工单位桩基础施工过程中存在基础管桩打桩不符合规范要求，偏差较大的问题。

以上问题请总包单位相关负责人引起重视并加强管理，现我预收购单位要求，中国电建集团江西省火电建设公司二期项目部相关人员督促施工单位对基础管桩打偏的问题进行整改，限期 3 日内完成并回复，并且在整改期间不得进行下一道工序，否则后果自负。

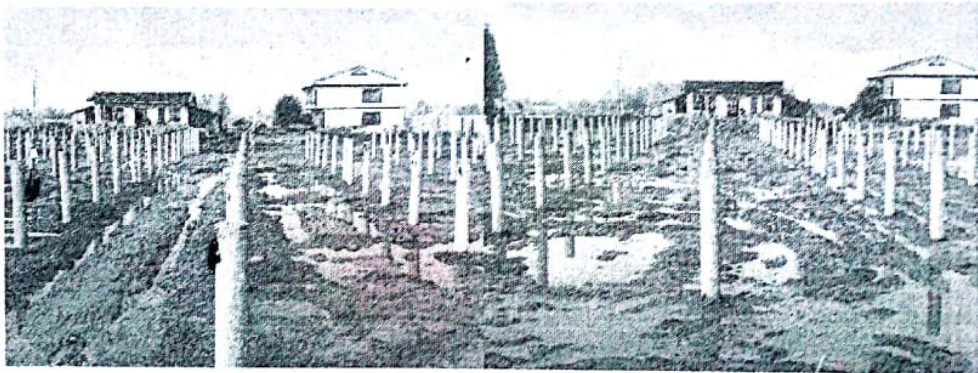

预收购单位代表签字：

2017 年 11 月 15 日

何月文
监理签字（盖章）：

2017 年 11 月 15 日

总包单位签字（盖章）：

2017 年 11 月 18 日

注：本表一式 3 份，由项目管理机构填写，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。



监理工程师通知单回复单

编号: 002

工程名称	益阳大通湖二期 100MW 渔光互补并网发电项目	合同编号	
致北京京能清洁能源电力有限公司监理部: 我单位在收到 002 号监理通知单后, 已按要求整改完毕, 请予复查。 附件: 整改情况 施工单位 (章) 专业工程师: 张戈 2017年11月18日			
监理单位复查意见: 经审查, 整改后符合设计及规范要求 监理签字 (盖章): 何习文 2017年11月18日			
预收购单位复查意见: 经审查, 整改后符合规范要求 单位代表签字 (盖章): 刘忠亮 2017年11月18日			



由 扫描全能王 扫描创建

