

监 理 整 改 通 知 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 015

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于 15#基础浇筑的相关事宜

内容: 你单位承建的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》:

1、2018 年 3 月 15 日进行 15#基础混凝土浇筑, 西南角塔基浇筑至第二承台, 东南角塔基浇筑至第三承台时停止浇筑, 没有连续施工一次成型, 不符 GB50010 规范要求。

2、13#、14#、15#基础浇筑施工没有提前报备, 私自更换水泥厂家, 三基基础出现质量问题与业主方和监理方无关。

3、13#基础拆模后出现蜂窝麻面现象, 要求你方对出现该现象的部位进行修复, 并于 3 月 17 日前完成。

以上问题的严重性已向你施工方说明, 也已向业主汇报, 希望贵方尽快制定解决方案整改问题。要求你方于 2018 年 3 月 17 日前完成整改, 整改完成前严禁进入下道工序; 并要求你方对第 1 条、第 2 条质量问题做第三方检测, 如果未做第三方检测, 业主方和监理方对此基础不予认可。



问题图片见附页:

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 孔庆国

日期: 2018 年 03 月 15 日



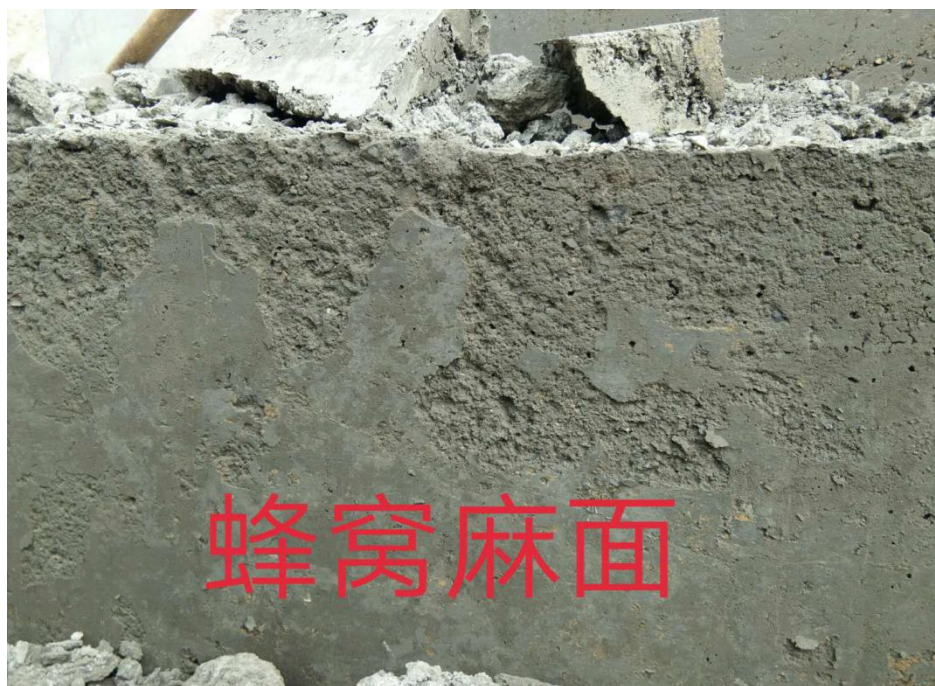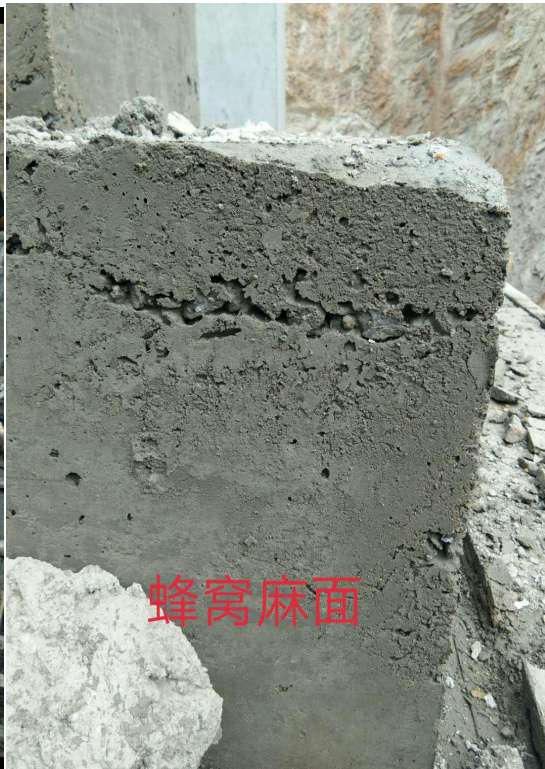

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

