

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-004


致:中国电建集团河南工程公司

事由:关于现场施工质量事宜

内容:监理人员对贵单位光伏区施工检查中发现质量问题如下:

- 1、3区、四区电缆沟接地埋深不规范、电缆敷设杂乱,且沟内土块、杂物较多。
- 2、个别汇流箱安装未按施工图及规范要求施工,汇流箱底边距地面高度太短。
- 3、个别逆变器 4 mm² 电线埋地处未穿套管,镀锌接地焊接处药渣未清理干净。

要求贵单位对上述问题限期五天内整改完成,并对施工人员做好技术交底工作确保工程质量,整改完成后报监理复查,验收合格后,再进行下道工序施工。(详见附图)

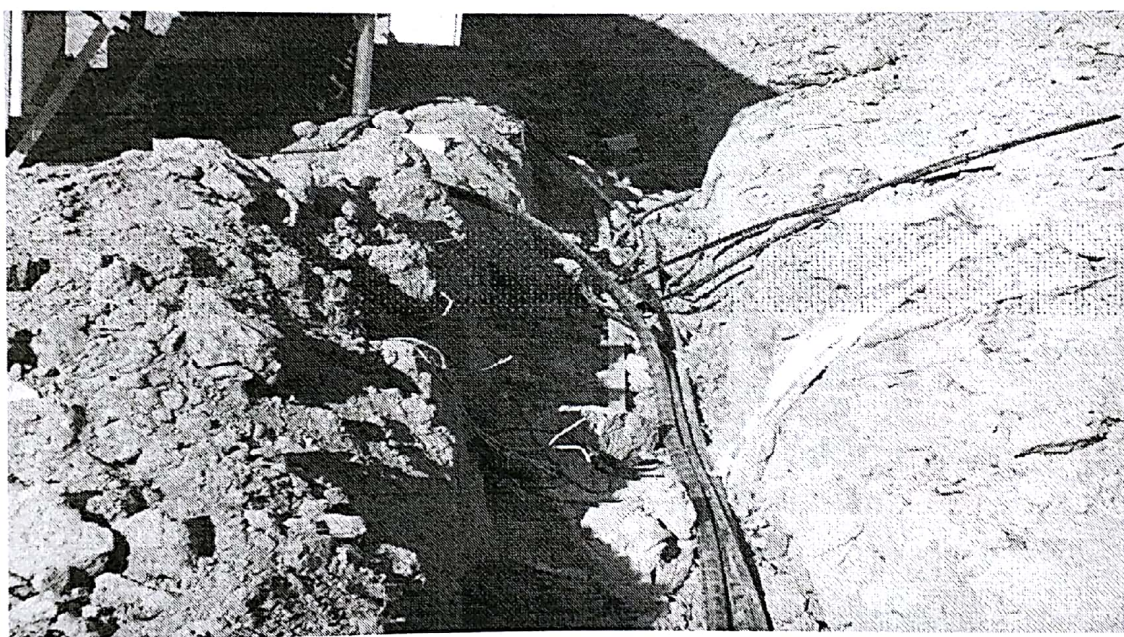

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__1__份。
