

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-061

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司


主题：关于综合楼地面下沉和卫生间地面做法的相关事宜

内容：1、监理巡视过程中发现综合楼一楼地面下沉，下沉幅度最大处 10 公分，上二楼楼梯底部处于悬空状态，现要求相关施工单位立即处理。

2、关于综合楼卫生间地面做法，施工单位严格按照设计规范和图纸要求施工。



(4) 地面：硬化砂浆找平	(1 卫生间门外房前)	(第 17 页 1001 号 203)
1. 20 厚细石混凝土找平，水泥砂浆嵌缝或 1:1 水泥砂浆找平		
2. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆		
3. 1.2 厚合成高分子防水卷材基层处理剂一遍		
4. 最薄处 15 厚 1:3 水泥砂浆或 30 厚 C20 细石混凝土找平层		
5. 80 厚 15 混凝土		
6. 素土夯实		

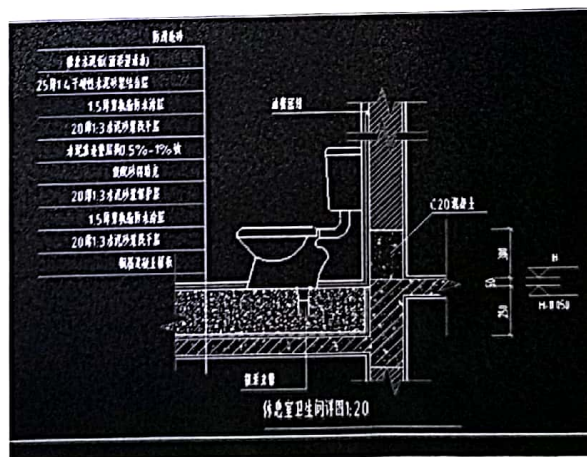

以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 5 月 01 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建
