

# 监理工程师通知单

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MW<sub>p</sub> 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-072

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区消缺整改相关事宜：

内容：

1. 光伏区汇流箱电压、电流、支路故障等相关问题统计表已下发，各施工单位要抓紧整改，逐一排查，整改完成后报项目部复查。
2. 场区个别区域的杂草树木存在清理不到位的情况，各施工单位要合理安排消缺人员对场区的遮挡情况认真排查，发现问题及时处理。（图一）
3. 光伏区部分区域电缆沟及接地沟开挖深度不符合规范要求，电缆敷设必须严格按照规范要求施工。（图二）
4. 箱逆变平台爬梯处于悬空状态，除锈、防锈处理不到位，存在安全隐患。（图三）
5. 场区内剩余材料回收处理不及时。（图四）
6. 箱逆变平台下方及汇流箱防火封堵不到位。（图五）
7. 监理巡视光伏区发现有两块组件因边压块及螺栓不紧固的问题，出现脱落的情况，这个问题必须重视起来，各施工单位要对区域内的边压块及螺栓进行仔细认真排查，发现问题立即处理。（图六）
8. 场区围栏要严格按照设计要求施工。
9. 近期场区施工及消缺人员少，请你方合理组织人员，有序推进总体工程进度。
10. 其它未尽事宜请自纠自查。

以上问题你项目部必须认真落实，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2018年8月26日 前回复本项目监理部。

附件：现场质量问题照片汇总表 2 页。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期： 2018 年 8 月 23 日



由 扫描全能王 扫描创建

### 现场质量问题照片汇报表

项目名称：华直当阳市庙前镇 4×20MW<sub>p</sub> 地面分布式农光互补光伏发电项目

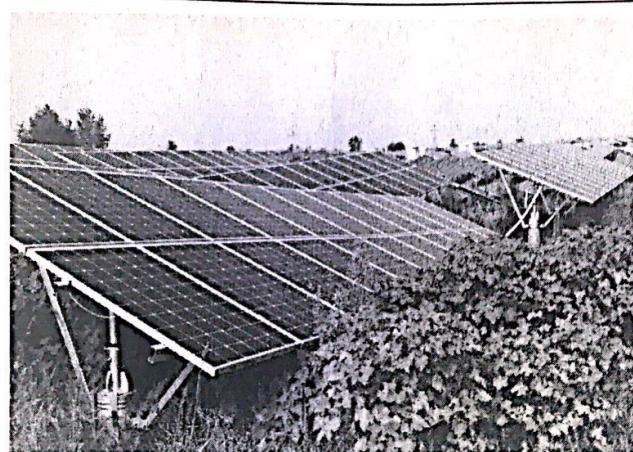


图 1 杂草清理不及时



图 2 电缆敷设不符合规范要求

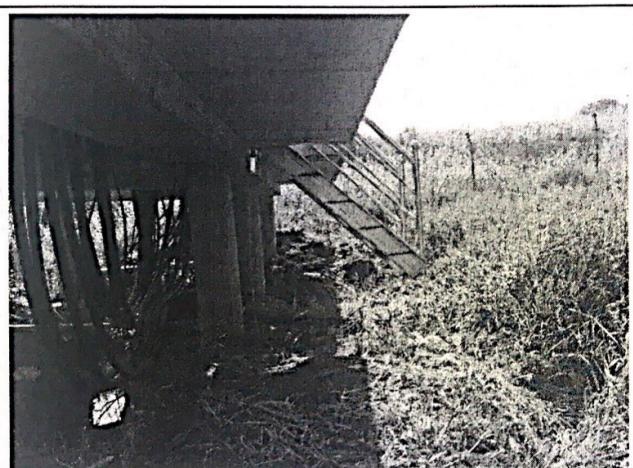


图 3 爬梯处于悬空状态

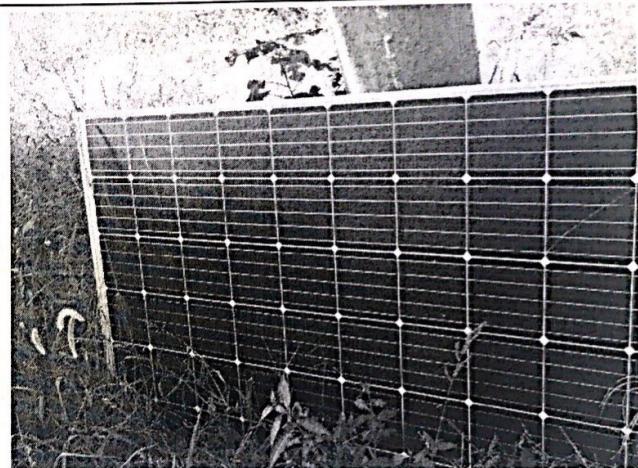


图 4 材料回收不及时

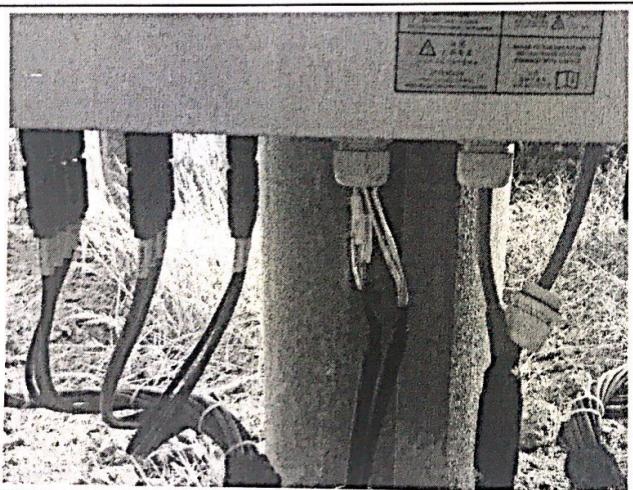


图 5 防火封堵未做

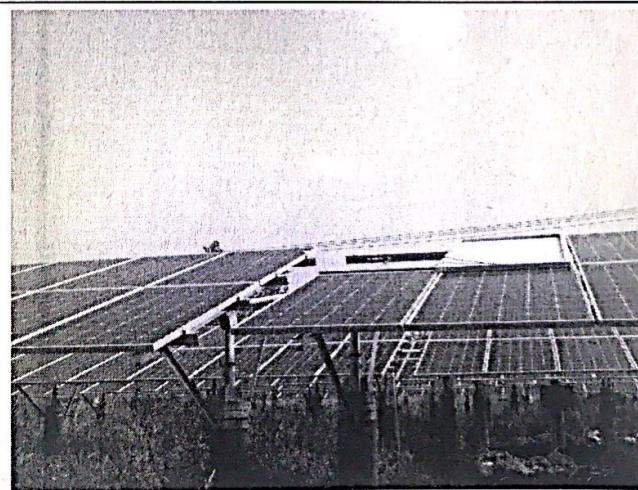


图 6 组件脱落

常州正衡电力工程监理有限公司当阳项目监理机构

日期：



由 扫描全能王 扫描创建
