

## 监理工程师通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4\*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-092

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于 16 区施工质量相关事宜

内容：根据施工单位申报 16 区消缺完成检查，检查结果如下：

1. 部分光伏板高低落差大、存在遮挡现象。
2. 部分组件安装倾斜角不符合设计要求。
3. 部分组件压块安装不到位。
4. 部分组件支架固定螺栓安装缺少垫片。
5. 光伏区围栏破损未修复。
6. 部分支架基座与桩帽焊缝不合格，桩帽除锈防腐刷漆不合格。
7. 箱逆变平台预埋件防腐防锈未施工。
8. 箱变漏油池质量不合格。
9. 箱逆变平台爬梯基础不符合要求，爬梯防腐防锈未施工。
10. 汇流箱支架、螺栓有锈蚀现象。
11. 支架接地连接不符合设计图纸要求。
12. 箱逆变平台下方线缆未摆齐整理。
13. 箱逆变平台二次灌浆未完成。
14. 汇流箱命名编号未完成。
15. 支架斜拉杆安装未紧固。
16. 部分组串间线缆套管未固定、封堵。
17. 场区电缆沟埋深不符合设计规范要求。
18. 其他未尽事项请根据施工合同和设计图纸施工完成。

以上存在问题必须及时整改到位，否则该部分工程量项目监理机构有权不予计量。请将施工整改结果于 2019 年 3 月 24 日前回复本项目监理机构。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 3 月 20 日




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




由 扫描全能王 扫描创建


## 问题照片汇总

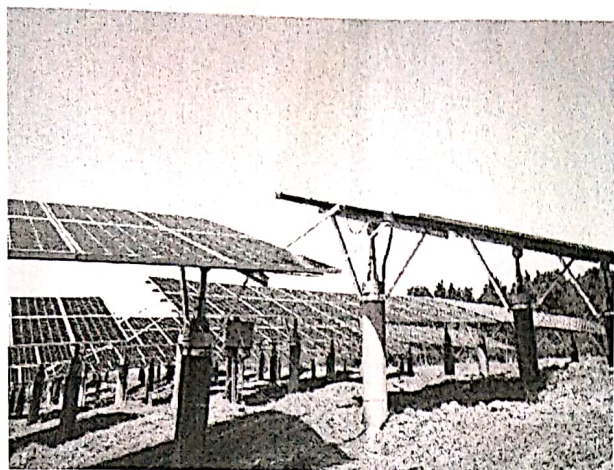

光伏板高低落差大、存在遮挡现象

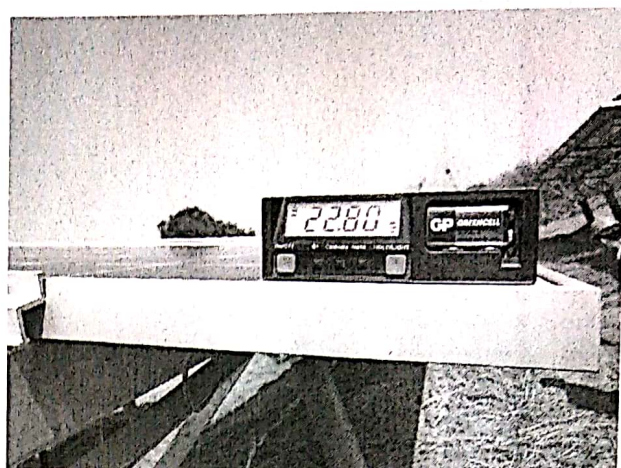

组件安装角度 22.8 度

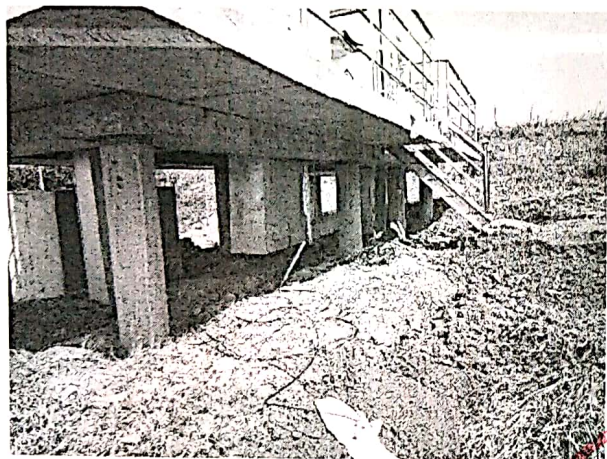


箱逆变平台下方线缆未摆齐整理



箱逆变平台爬梯基础不合格



汇流箱命名编号未完成

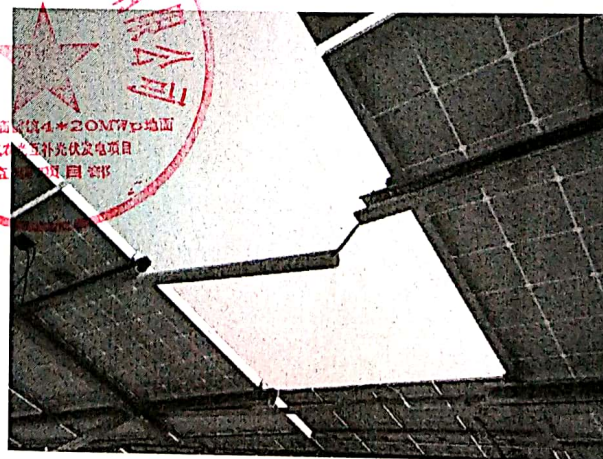


组串间光伏电缆套管未固定、防火封堵






场区电缆沟埋深不符合设计规范要求

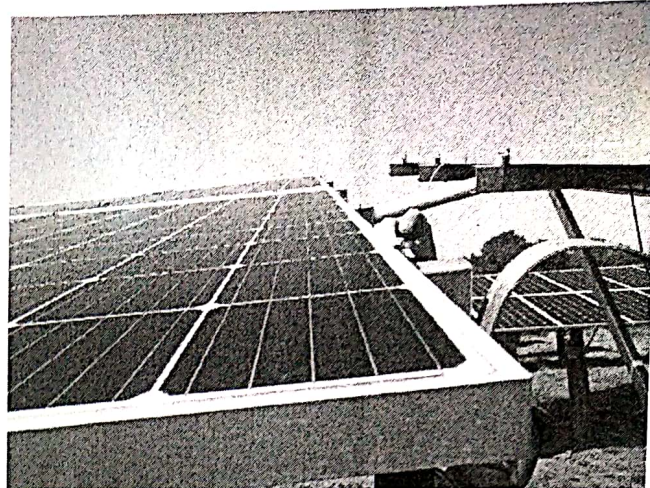


组件压块安装未紧固



组件压块固定螺栓缺少垫片

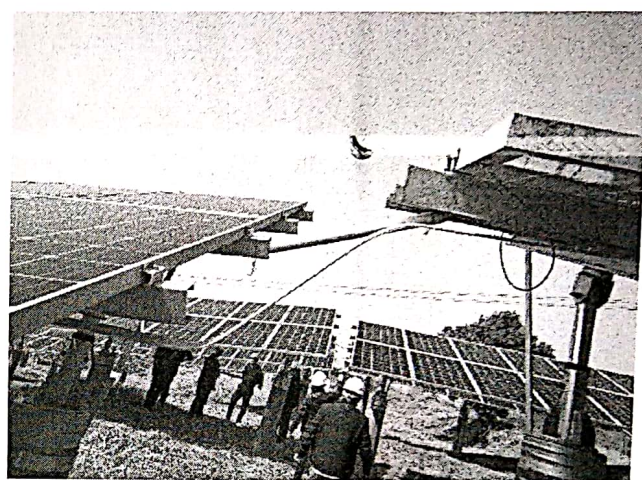

支架接地连接不符合设计图纸要求

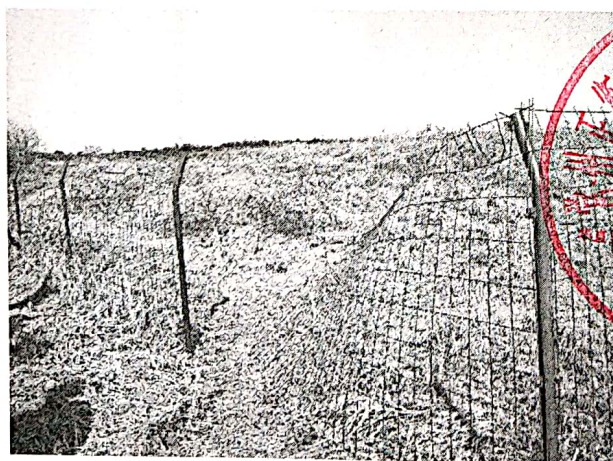

场区围栏破损未修复



箱变漏油池不符合设计要求

