

监理通知单

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDRLMY-011

致: 西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由: 关于光伏区清洗系统的问题

内容:

2018年08月31日上午08时, 监理人员对光伏区清洗系统安装巡视检查发现以下问题:

1. 屋面跨越采光带圆拱处管道未固定。
2. 屋面敷设的清洗管道局部保温措施未做到位, 保温材料短缺。
3. 厂区内取水点处清洗管道保温措施不到位、水表未固定、泄水阀安装不合理、进入原厂落水管口处不能高于弯头, 以防进入冬季积水, 损坏弯头。
4. 清洗系统安装完成后必须进行管道试压, 否则不予以验收。

附: 问题照片

以上问题要求在验收之前整改完成, 否则一切后果由你公司承担。

如对本监理通知单内容有异议, 请在24小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构(章):


总/专业监理工程师:

日


期:




注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部一份。

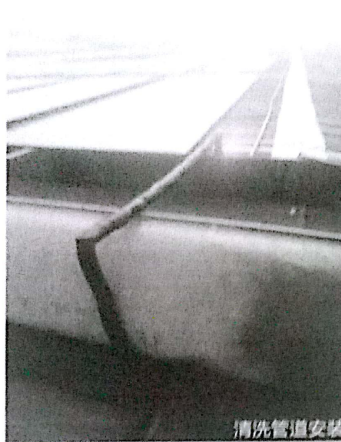

管道未固定

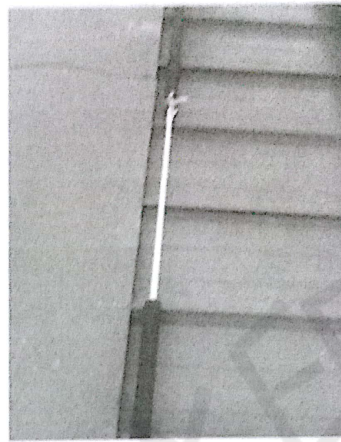

管道保温不到位

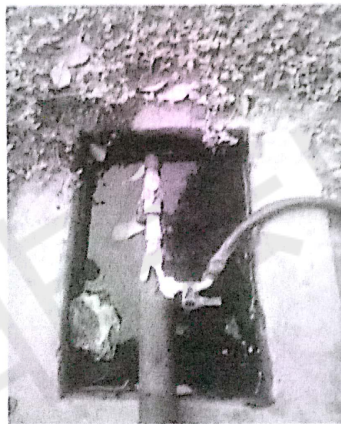

管道需保温



管道需支护、需保温
