

监 理 通 知 单

工程名称：西安天虹电气 1.4MWp+0.312MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-002

致：中船重工西安天虹电气有限公司


抄送：陕西国力光电能有限公司

事由：关于现场桥架跨接接地及接地扁铁的焊接问题

2017年12月28日10时监理巡视发现你单位在施工过程中存在以下问题：

1. 屋顶铺设的电缆桥架未使用跨接接地线连接，不能保证桥架可靠接地。
2. 屋顶焊接四周的 4*40 镀锌接地扁铁焊接截面达不到规范要求，应不小于截面的 2 倍及焊接时不准许在扁铁上烧弧。

以上问题要求你方于 2017 年 12 月 29 日之前立即整改，整改后报监理部验收，并给予我监理部书面回复，否则一切后果由你公司负责。

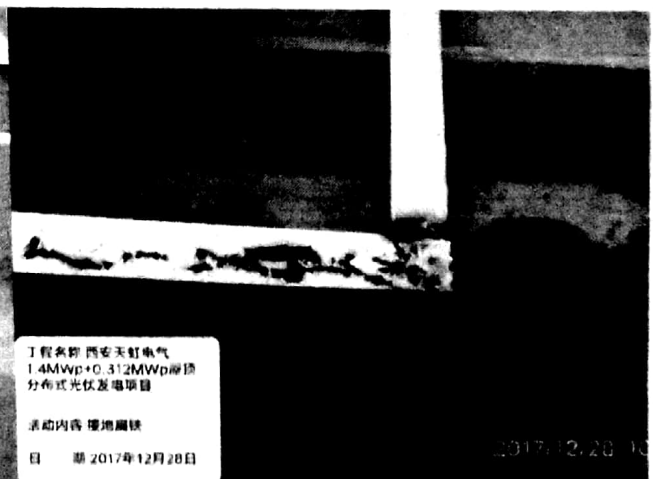

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日 期：2017年12月28日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部、监理项目部各存二份。
