

监理通知单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)


编号：ZHJL-YHGS-11

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于桩基校正及立柱修补事宜

由于 2 区水塘及南侧 3 号区域水塘整体打桩效果不佳，管桩歪斜，部分管桩下沉严重导致桩顶标高不齐。导致后续施工难度加大，支架、组件安装不平整。部分桩顶立柱未经许可私自切割，给本工程带来了严重的质量隐患。现要求你方：

- 1、对歪斜、下沉管桩及时进行校正后再进行桩顶立柱的焊接。
- 2、桩顶立柱的焊接禁止再有切割立柱情况发生，桩顶立柱焊接必须用水准仪进行校准后再进行支架等后续安装施工。
- 3、对已经切割的装订立柱要及时进行修补，明天下班之前必须提供具体的施工方案。修补焊接过程中注意对组件的保护，用石棉瓦隔热保护，避免因高温等造成组件的隐裂、灼伤，影响组件的发电效率。

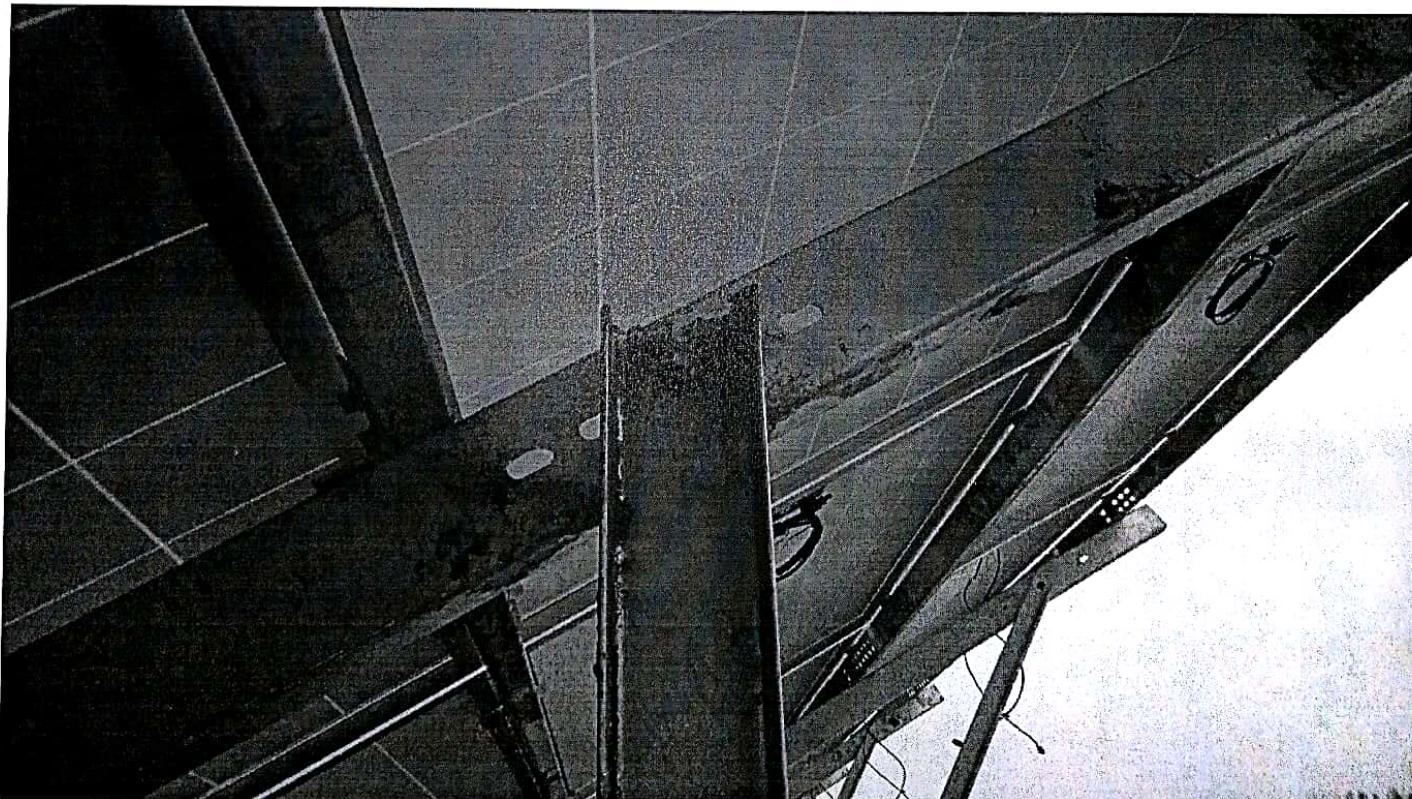

正清电力工程有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：
日期：2018年1月23日
