

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)


编号：ZHJL-YHGS-13

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于施工质量问题

现场巡视发现问题：

- 1、汇流箱安装螺栓所用垫片过小，螺栓垫片不能完全盖住支架安装孔。要求你方另行加装大型号垫片，确保汇流箱稳固可靠。
- 2、站内已安装完成电缆桥架起伏偏差较大，影响工程整体美观，你方及时进行调整。
- 3、电缆桥架连接处未跨线连接。
- 4、组件安装施工我方多次下发通知单，但安装质量仍欠佳。要求你方加强对施工人员的培训并每安装完成一排之后进行自检，对安装不平整的阵列及时调整，确保施工质量及美观。
- 5、汇流箱至逆变器电缆敷设过程中，桥架尽头处电缆未保护，易造成电缆划伤。
- 6、部分桩顶立柱偏差较大，焊接面不足，必须加装支架，孔洞处必须用钢板补焊。

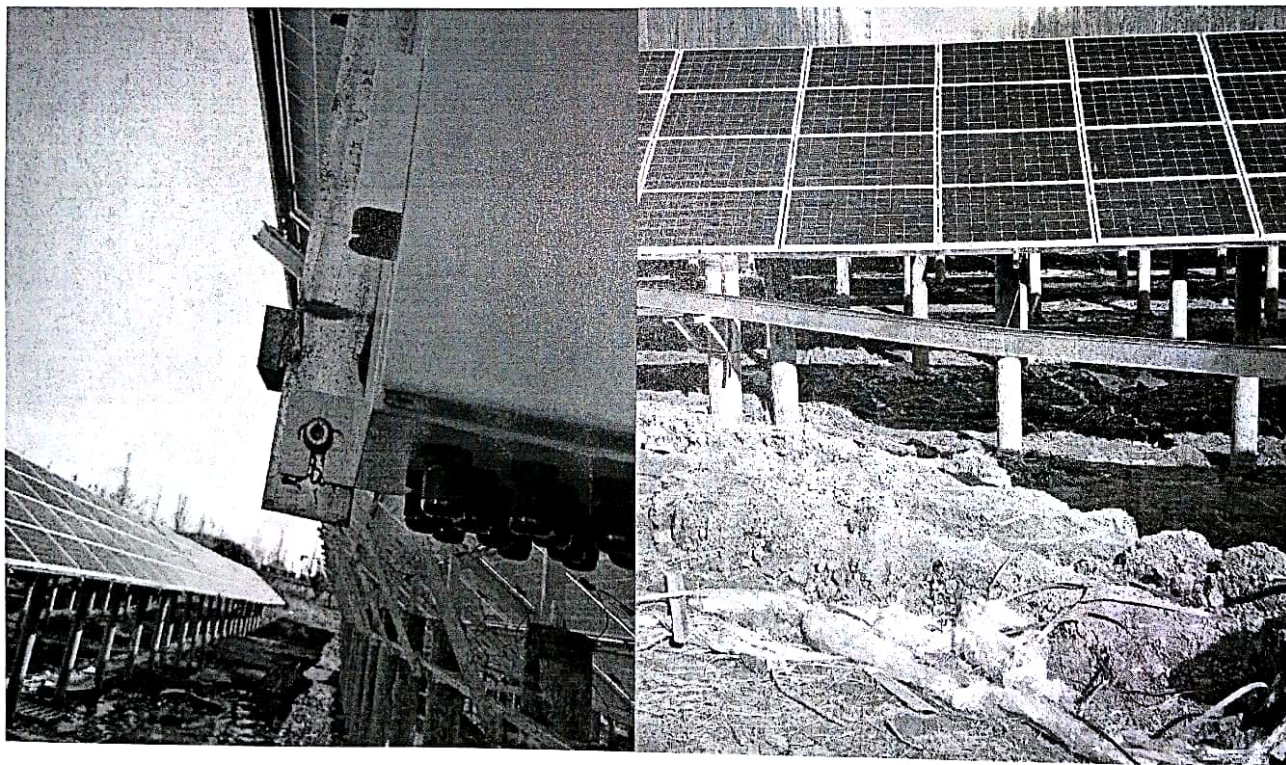



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：1010101

日期：2018年11月24日

监理项目部
