

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-020

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部


事由：关于施工进度和质量问题

现场巡视发现以下问题：

1. 自 3.10 号开始校桩至 3.12 号，由于校桩施工人员只有 2 人，且需校正管桩数量较大，进度十分缓慢，如此下去，会严重影响后序工作的实施和整个项目的并网计划。



2. 3#、4#区域个别管桩歪斜严重，焊接立柱偏离桩顶中心较大，需校正和整改。

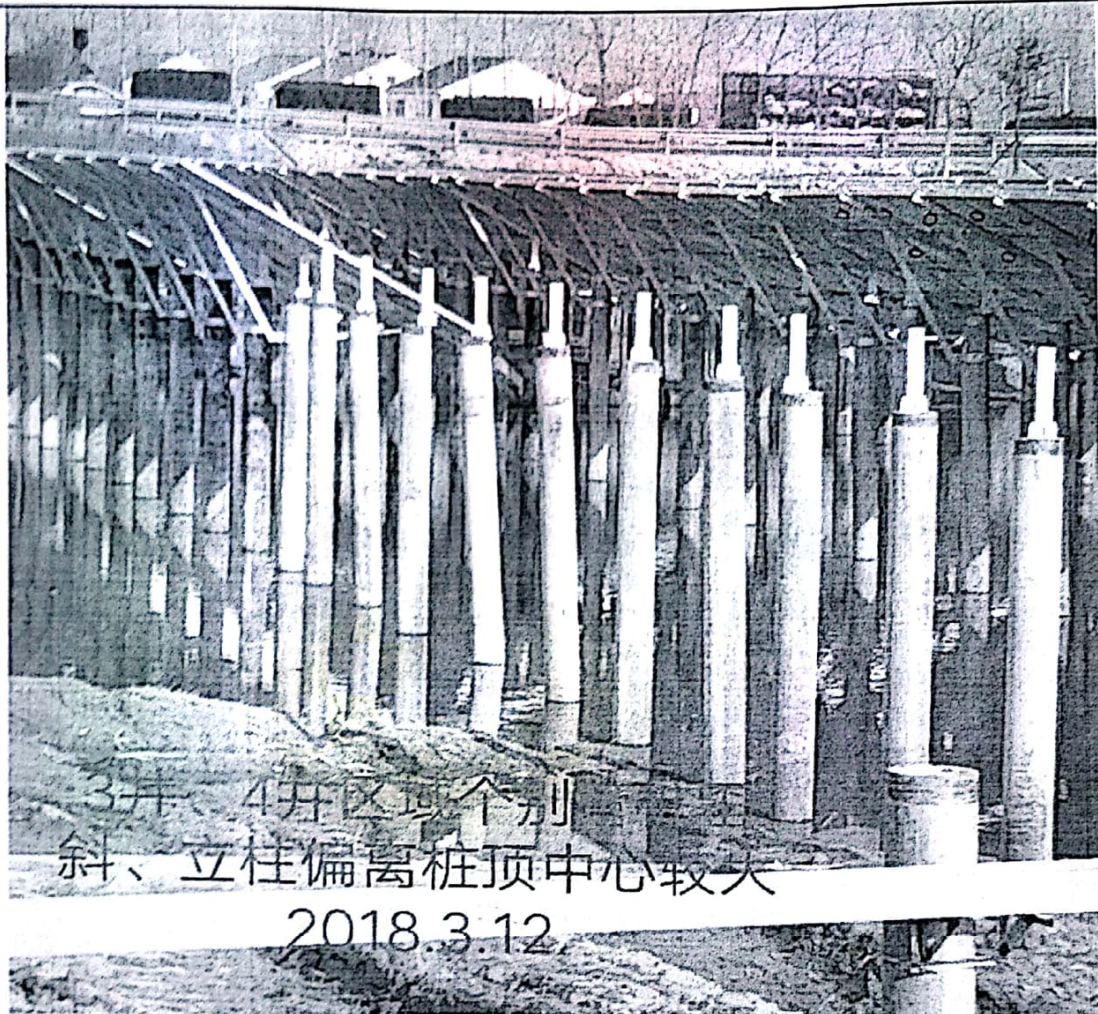

3井、4井区域个别
斜、立柱偏离桩顶中心较大

2018.3.12

针对以上问题，望你项目部立即采取有效措施，制定加快校桩进度的方案，整改偏离管桩中心较大的立柱，三日内彻底校正和整改完毕，在自检合格的基础上报监理项目部验收，验收合格后方可进入下道工序施工，否则将报请业主对你项目部进行严厉处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 董黎明

日期: 2018年3月12日

