

监 理 通 知 单

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: ZHJL-YHGS-05

致: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部


事由: 关于施工质量问题

现场巡视发现 2 区水塘内桩头焊接开始施工。发现以下问题:

- 1、部分管桩基础垂直及水平度偏差较大, 桩顶标高参差不齐, 有下沉情况。
- 2、至今未收到你方相关工序的报审材料就开始下一工序施工, 我方不予承认合格。
- 3、桩基试验合格报告未提供。

请你方及时对不合格的管桩进行校正或提供具体的施工方案, 提供试验合格报告, 相关工序及时报验后再进行施工。

以上问题望贵部接到通知时立即采取措施, 并及时作出整改。

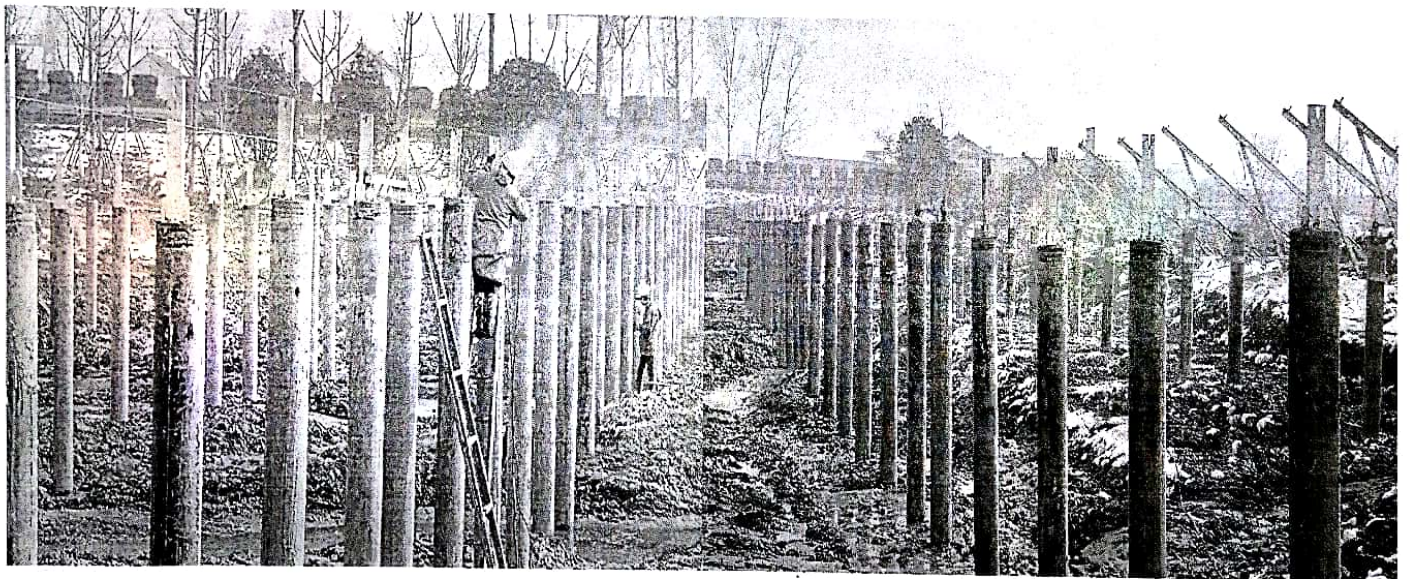

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2018 年 1 月 6 日

云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目
监理项目部
