

监理通知单

工程名称:步凤镇 26MW 农光互补光伏项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-002

致: 常州天合光伏发电系统有限公司 项目部

事由:



关于 1#地块管桩施工、管桩试验及资料报审事宜。

内容:

- 1、局部桩身垂直度偏差较大,超出规范规定准许偏差,允许偏差(每米 <5 全高 <10)且影响整体观感。
- 2、局部桩顶标高超出误差允许范围,(按照设计要求桩顶标高允许偏差 0, -10mm)个别桩顶高出同区域桩顶 90mm 米左右,影响后序支架安装。
- 3、局部管桩横向与纵向偏差较大,允许偏差(± 10)影响下道工序正常施工。
- 4、进场管桩没进行第三方检测。
- 5、没按图纸要求进行管桩试验。
- 6、开工已十多天,监理多次督促资料要和施工同步进行,你方资料至今没向监理部报审。

要求:

以上问题要求你方抓紧整改、落实,及时回复。

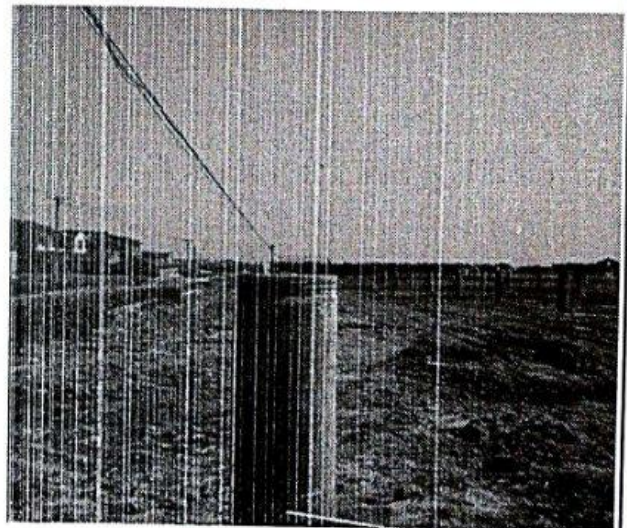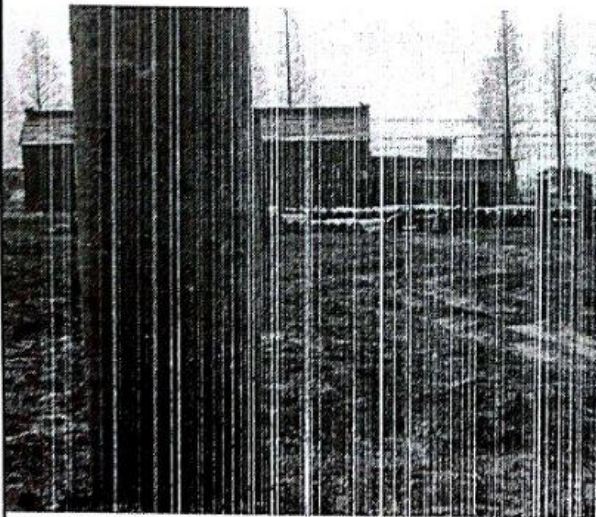

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2022年3月29日

常州天合光伏发电系统有限公司
步凤镇 26MW 农光互补光伏项目
监理项目部

注 本表一式 3 份,有监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。
