

监理通知单

工程名称:步凤镇 26MW 农光互补光伏项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-004

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部
事由:



关于 1#地块管桩顶部竖向钢板焊接、管桩施工及图纸移交事宜。

内容:

经监理巡视检查发现你单位在管桩施工及 1#地块管桩顶部竖向钢板焊接时出现以下问题:

1. 管桩施工时管桩中心线、标高及垂直度少部分超出设计准许偏差范围,特别是管桩中心线偏差较大,给后期工序施工造成很大难度。
2. 1#地块桩顶竖向钢板焊接中心线位移偏大,严重影响施工质量和观感。
3. 至今为止设计单位仍然没把管桩钢结构图纸交付监理方,使监理方无法了解图纸设计要求,导致监理方无法做到事先控制。

鉴于上述施工现场出现问题,监理在现场及监理例会上已多次警告通知,你单位仍然没做到有效控制和认真整改,监理要求打桩队暂停 3#4#地块打桩,直至把已施工完成管桩矫正合格后在行向前进行管桩施工。

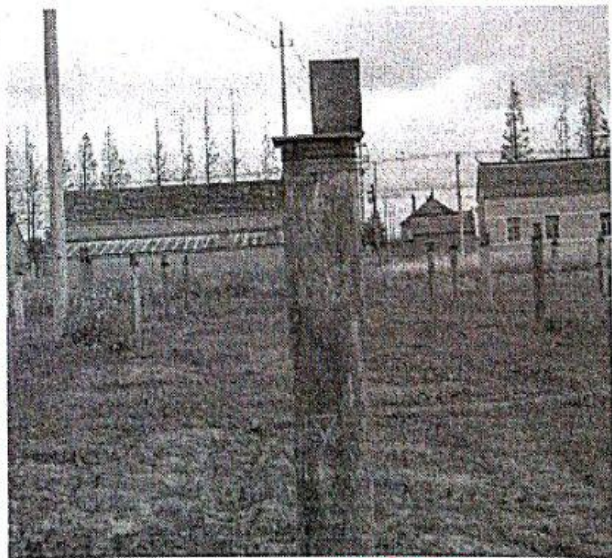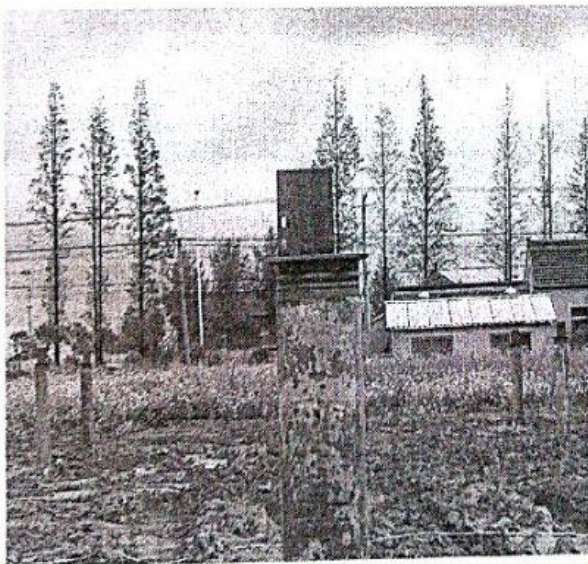

监理项目部

(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 4 月 14 日
