

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目


编号：ZHJL-ZJTS-025

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于支架安装质量的事宜

内容：

光伏区已进入支架、组件安装阶段，现场巡视检查发现支架安装高度不合格，特别是 2 号地，前沿距地面高度只有 700mm-800mm，设计图纸要求光伏组件安装后前沿距地面高度为 1200mm。现要求立即停止组件安装，进行全面整改。

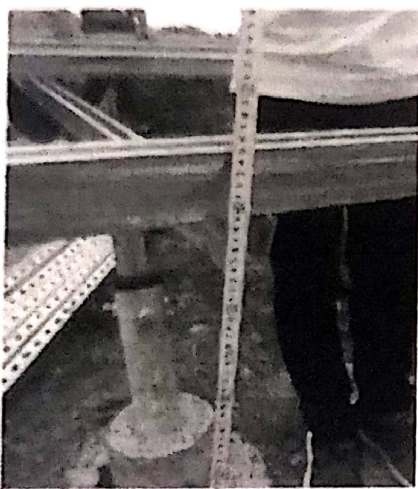

望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理项目部检查验收。

限两天内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019 年 5 月 21 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
