

监理通知单


工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-030

致: 珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由: 关于支架安装质量的事宜

内容: 监理项目部现场巡视检查发现: 4号地补容部分个别光伏阵列支架安装高度不合格, 前沿距地面高度只有 400mm, 组件安装后更低。现要求立即停止安装, 支架立柱必须加高, 达到要求后才能进行安装。个别光伏阵列前沿距地面 300mm-400mm, 必须进行整改。

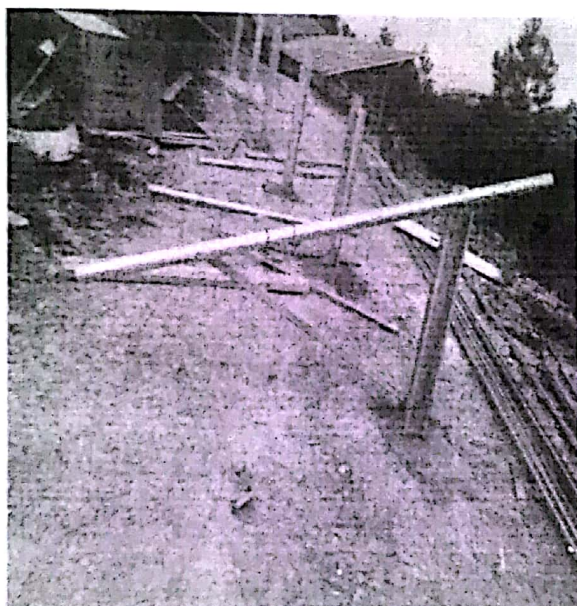

望你部高度重视以上问题, 落实整改, 整改完成后报监理项目部检查验收。

限 3 日内回复。



项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

葛庆琦

日期: 2019 年 9 月 16 日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建
