

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-004

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部


事由：关于安全施工事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

1. 开关站电控楼深基坑开挖，根据国家施工规范未做放坡处理；
2. 深基坑开挖四周已出现裂缝，且未做挡土板支撑防护，存在安全隐患；

以上问题要求立即整改，未做好安全防护处理工作之前，禁止施工人员进入深基坑施工。

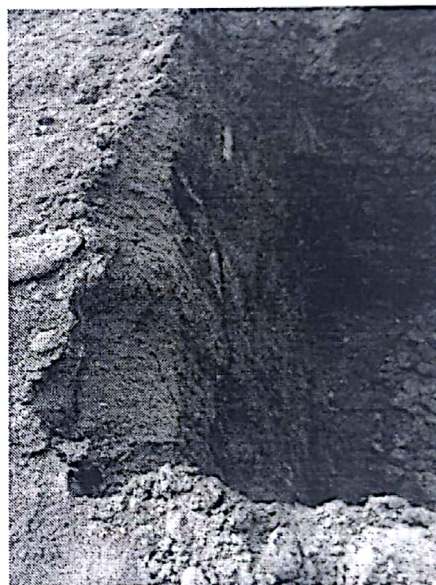

望你部高度重视以上问题，落实整改，限两天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：黎彩霞

日期：2018 年 10 月 31 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
