

## 监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-009

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

1、开关站电控楼立柱钢筋焊接、箍筋绑扎未经监理检查便开始模板支撑，现要求立即拆除已安装的立柱模板，检查合格后才能进行模板支撑。

2、立柱箍筋绑扎最高处与梁底之间距离偏大，不符合国家规范要求，现要求增加箍筋数量。

3、部分钢筋未全部按要求焊接便已绑扎箍筋，要求安排施工人员，认真检查所有需要焊接的钢筋，尽快全部按要求焊接。

以上施工部位未按照国家图集(16G101-1)规范施工，望你部高度重视以上问题，不符合要求处必须整改，限一天内回复。

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师： 

日期：2018年11月21日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附图：

一：

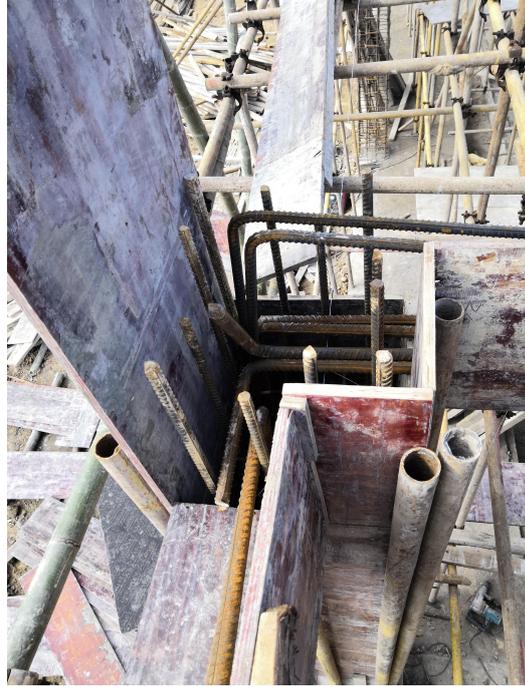

二：





三:

