

监 理 通 知 单

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程

宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程 编号：ZHJL-SDLX-TZ-06。

致：宁波新晟能源工程有限公司盛道、隆兴项目部

事由：关于施工质量和安全问题

2018 年 6 月 12 日经我监理方人员巡视施工现场检查发现：

1、隆兴厂区逆变器电缆接线存在施工质量问题：

依据《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796-2012 中规定：你方施工人员在逆变器接线施工中，对电缆线护套层剥离太深，三根线芯裸露在外。违反“线缆应排列整齐美观，外皮无损伤”要求。（附图 1）。

2、盛道厂区存在施工质量问题：

依据《光伏电站施工规范》GB 50794-2012 规范中 5.2.2 光伏组件的安装第四条：组件之间连接线不应承受外力；你方在光伏线绑扎施工中违反此规范。（附图 2）。

以上问题我监理方责令你方及时整改！请于两日内回复，若不及时处理我方将上报业主将进行工程项目考核。



监理单位（章）

总/专业监理工程师：胡国村

日期：2018 年 6 月 13 日



由 扫描全能王 扫描创建

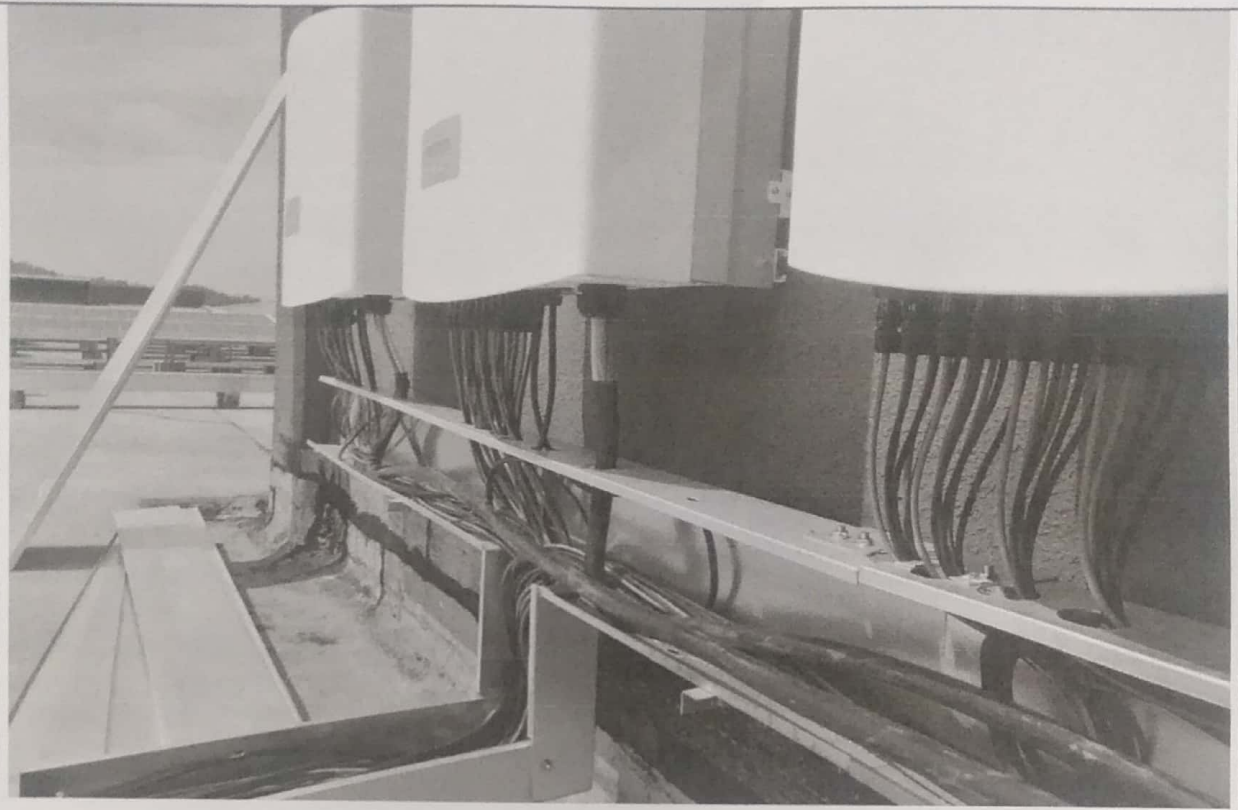


图 1

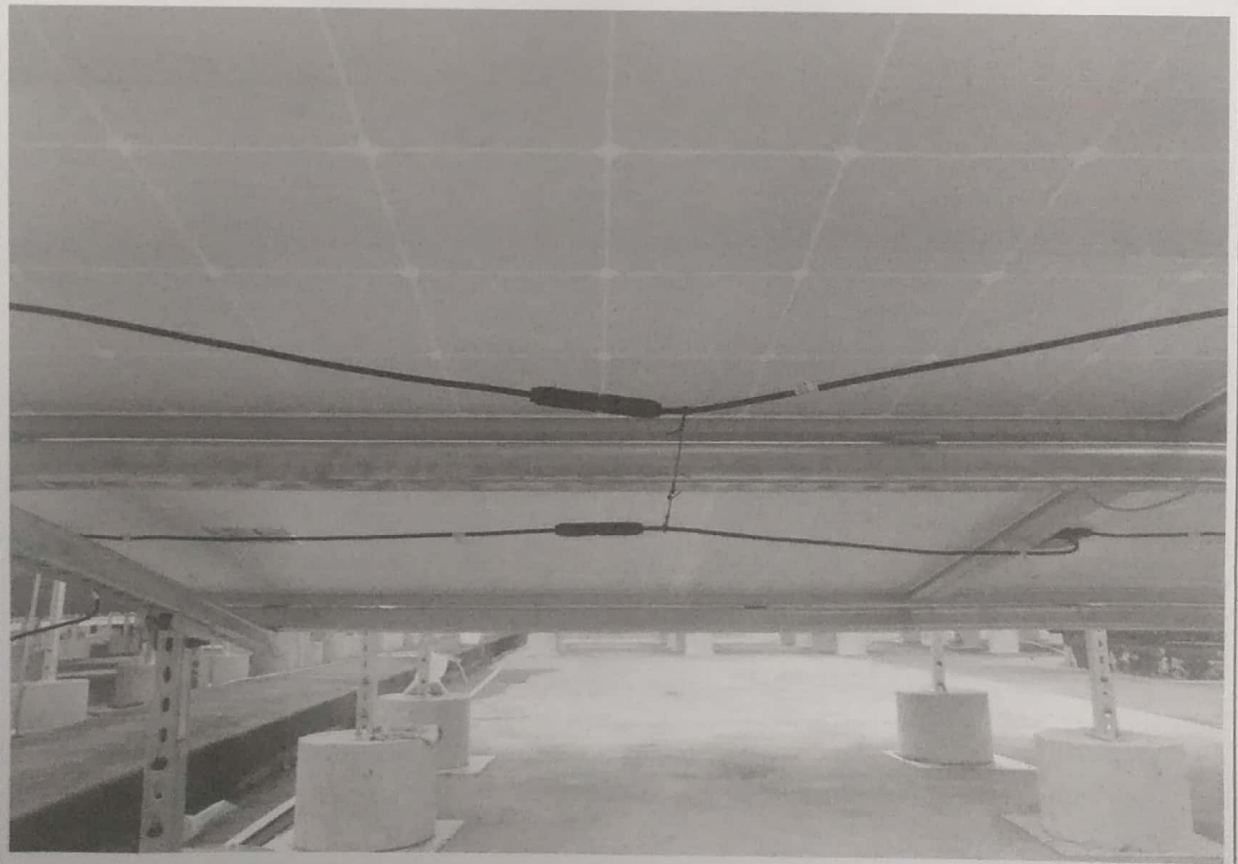


图 2

