

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-036


致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于升压站水泵房水井施工的事宜。

内容: 我监理部于 2019 年 01 月 19 日的巡查中,发现升压站水泵房水井施工时,水泵房水井未按设计图纸要求打在水泵房内、我方监理人员多次在监理例会上强调施工单位先打水井、然后在进行水泵房施工、施工单位不采取意见。现已经把水井打在水泵房外、未得到设计单位变更、未通知我监理部人员进行旁站,擅自打井。

现要求你单位在接到该通知单后立即进行整改;整改完成后、报监理部对水井深度、及位置进行验收。如不整改,出现一切后果你单位自行负责。

附: 问题图片

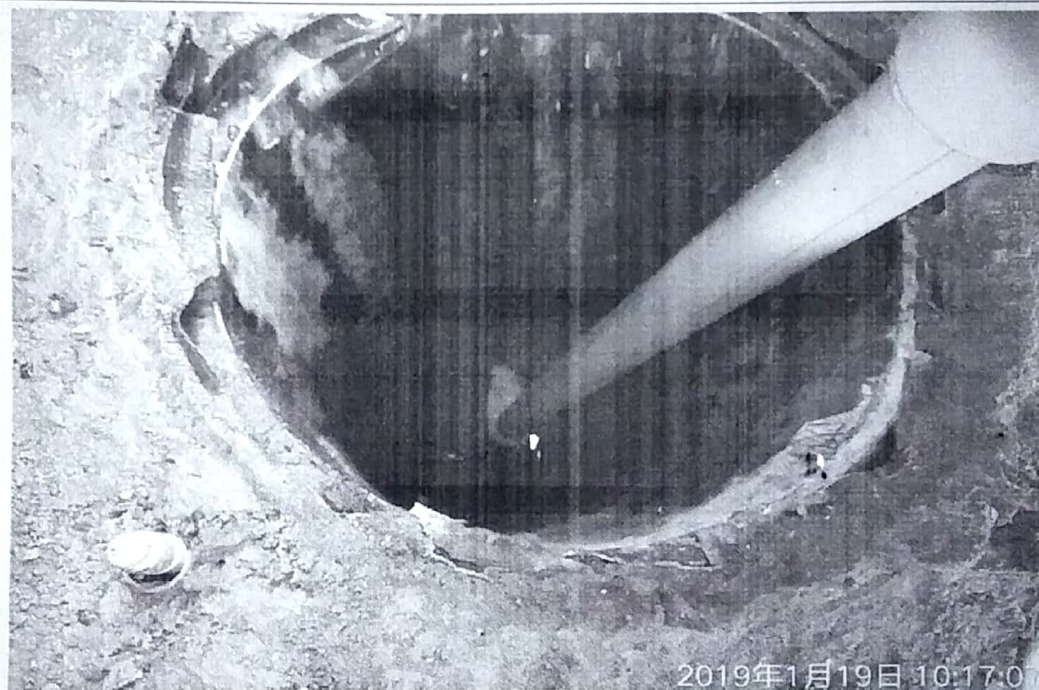

以上问题要求你单位在 2019 年 01 月 20 日 12 时前整改完成,并上报监理项目部验收。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: 黄书春

日期: 2019.01.19

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建
