

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-055

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区施工质量事宜

内容：

2019 年 4 月 12 日监理项目部对双河坝光伏区进行了巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、新施工的箱逆变平台基础管桩轴线偏差较大，不符合要求。
- 2、桥架转弯处里面电缆需做保护措施，防止桥架转角处割破电缆。
- 3、个别桩头立柱未满焊，不符合要求。
- 4、20#箱逆变电缆敷设后底部电缆线放置杂乱，不符合要求。
- 5、开关站及码头处高压电缆敷设还未施工完成，要求施工单位及时施工完成并报监理项目部验收合格后回填。
- 6、对于前期发送的监理通知单上还未整改的问题，要求施工单位及时整改回复。

针对上述问题，要求施工单位，严格按图纸设计及规范要求尽快整改完成，整改完成后自检合格再上报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。

后附相关问题照片。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2019 年 4 月 12 日


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




箱逆变基础管桩轴线偏差较大



桥架转弯处里面电缆未设保护措施

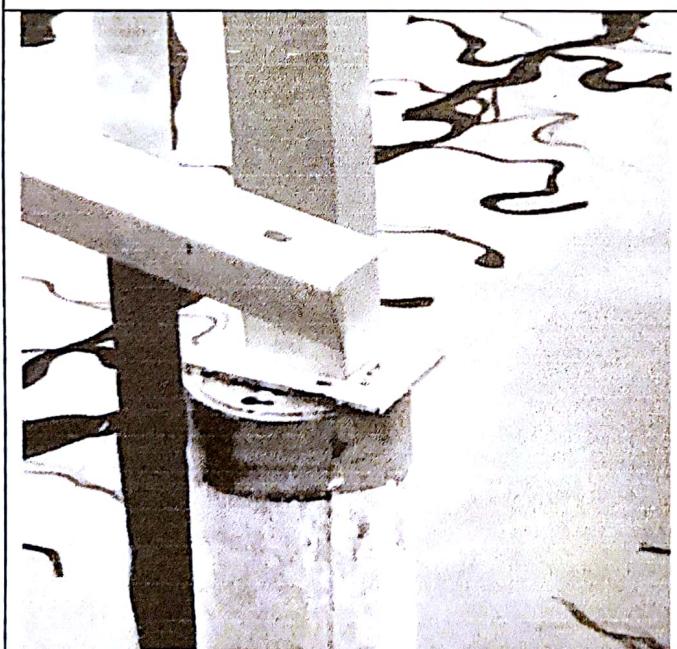

个别立柱没有满焊

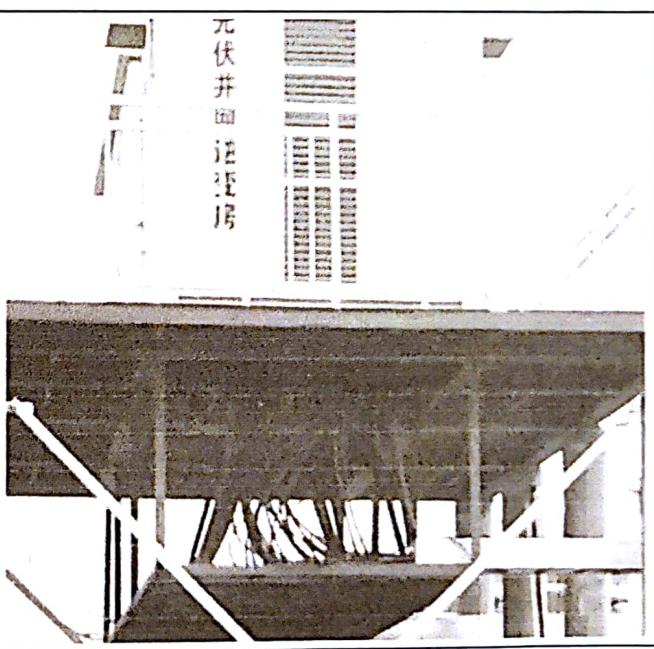

20#箱逆变底部电缆放置杂乱
