

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-058

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区集电线路高压电缆施工事宜

内容：

2019 年 4 月 30 日经监理项目部人员巡视检查发现，开关站大门至码头路段带电高压电缆还未敷设回填完成。此问题监理人员口头已多次提出，并在监理例会第 51 期、52 期中提出，要求施工单位及时完成敷设回填，但至今还未敷设回填完成，存在严重安全隐患。

针对上述问题，要求施工单位 3 日内整改完成，严格按图纸设计及规范要求施工，并要求高压电缆敷设完成后报监理验收合格才能进行隐蔽，如施工单位不能按时整改完成，后续将给予严厉处罚。

后附相关问题照片。

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）


总/专业监理工程师：

日

期：2019 年 4 月 30



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

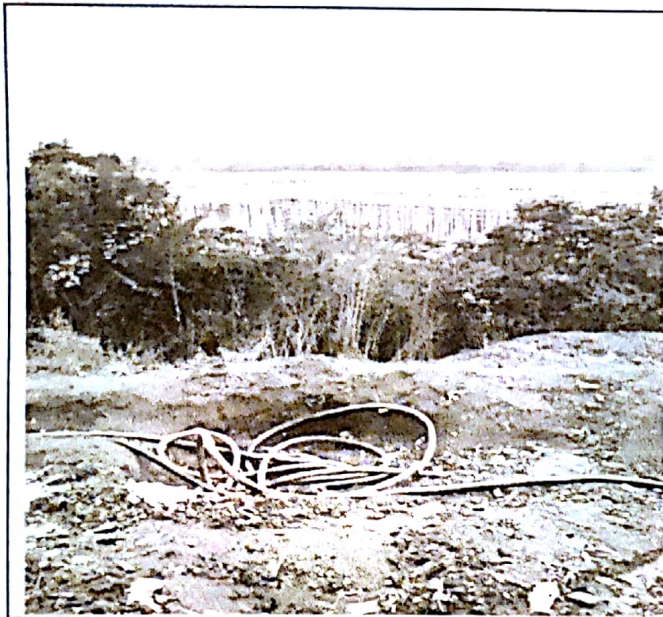

带电高压电缆线未及时敷设回填
