

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-063


致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区支架施工质量问题事宜

内容：

2019年11月11日监理人员对光伏区进行巡视检查，发现25区少数支架安装不符合要求，支架组与组之间两端排列不整齐，尺寸相差太大。现要求你单位对现场不符合要求的支架进行整改，按照设计、规范要求整改合格后才能进行组件安装。望你单位抓紧时间整改，并对类似问题严格自查，整改完成自检合格后报监理项目部复查，复查合格后方可进行下一道工序施工。

以上问题三日内回复。

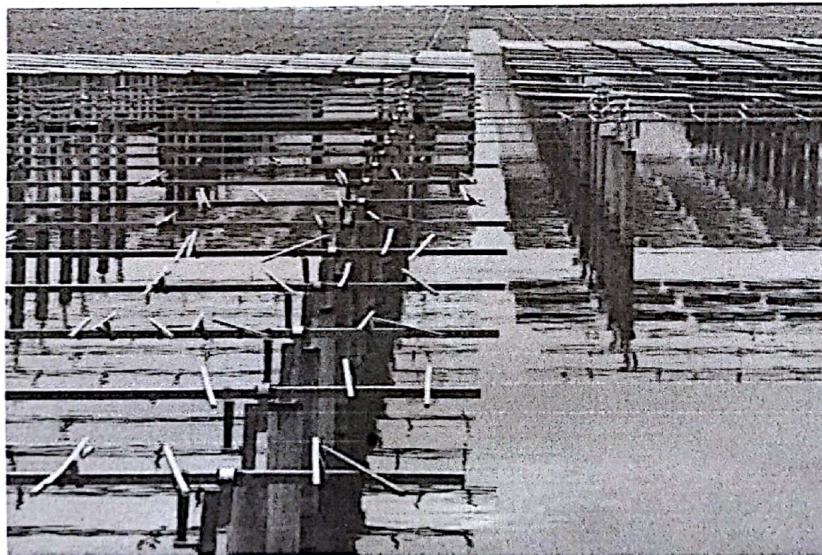

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月11日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
