

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-046



致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区管桩接桩图纸和施工方案事宜

内容：

2019 年 3 月 12 日光伏区现场管桩接桩已开始施工，但管桩接桩图纸和施工方案还未上报监理项目部，施工图纸要需要设计单位签字盖章和第三方图审单位审核通过，施工方案要经监理项目部审核通过并上报业主同意后方可实施，此问题 2018 年 9 月 18 日上电谈总已在第二十七次监理例会上明确提出了相关要求（详见会议纪要第 6 条），但施工单位至今未上报相关资料。

针对上述问题，要求施工单位立即暂停施工，抓紧提供相关资料，待监理项目部和业主审核通过后方可施工，否则将给予严厉处罚。

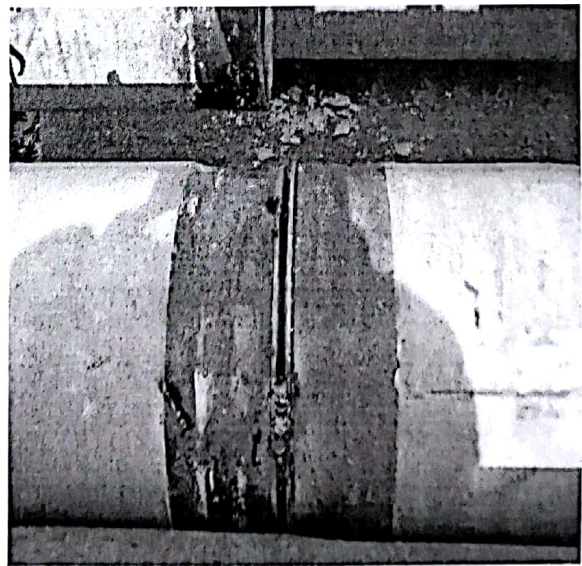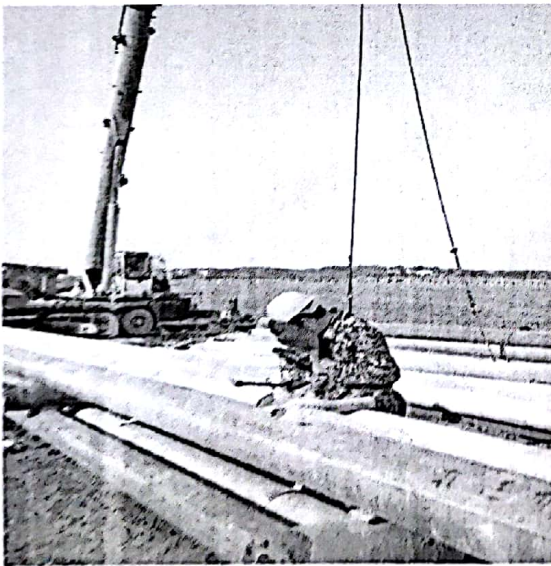

以上问题三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019

年

3

月

12

日

监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
