

湖南汨罗 2*20MWp 渔光互补光伏扶贫项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-ML-003


致:孚尧电力工程设计(上海)有限公司

主题:设计、质量、安全


内容:

- 1、根据上电新能源公司领导要求,SVG 变压器刀闸增设围栏(图一)。
- 2、接地变箱体接地扁钢焊接不符合要求(图二)。
- 3、升压站电缆沟砼盖板部份有破损、表面毛糙,需更换(图三)。
- 4、光伏区管桩位置、标高偏差大,导致如下质量问题:支架立柱与桩冒位置偏移过大(图四)、支架主梁呈高低不平(图五)、纵向整体支架不顺直(图六)。
- 5、支架立柱与桩冒位置偏移过大的,要出处理加固方案并上报监理审核,并按方案加固。
- 6、进站集电线路尽快埋设,管桩、支架料场边上的集电线路尽快做好保护措施,否则有很大的安全隐患(图七)。


要求在 2018 年 07 月 15 日前整改完成,并上报监理项目部。

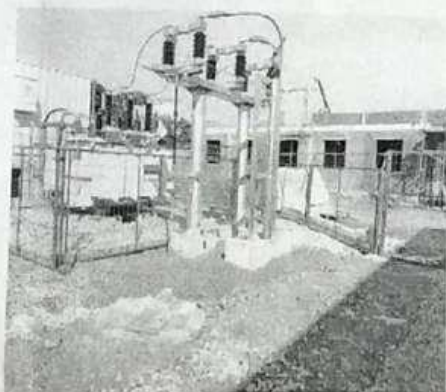


(图一)

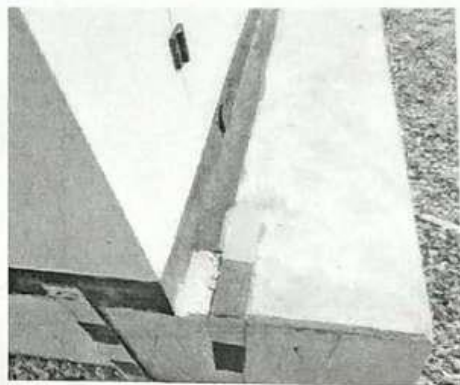

(图二)

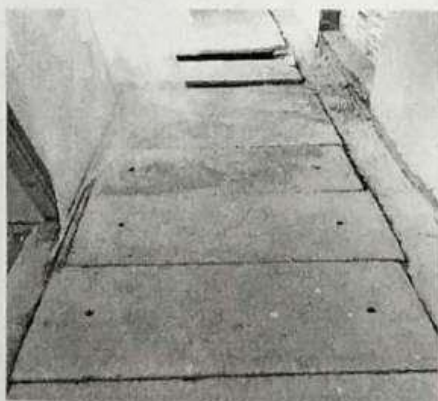

(图三)

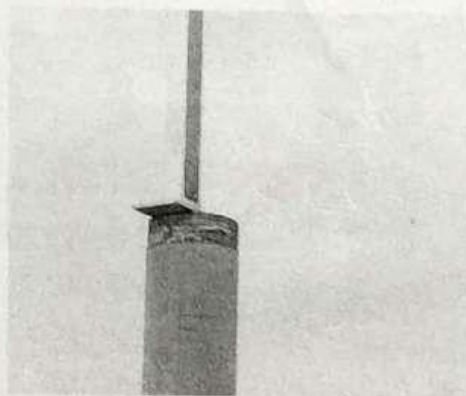

(图四)



(图五)



(图六)



(图七)

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期:2018-07-05

填表说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位
