

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180503


致: 中国电建集团勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部

事由: 现场施工质量问题

内容:

巡视升压站, 主变、GIS 等设备基础模板拆除后, 观感不理想, 水平面平整度差距大, 要求你单位设备进场安装前进行修改, 同时进行土建交付安装的自查, 自查合格后报建设、监理单位验收, 验收合格后进行电气设备的安装并留相关资料归档。

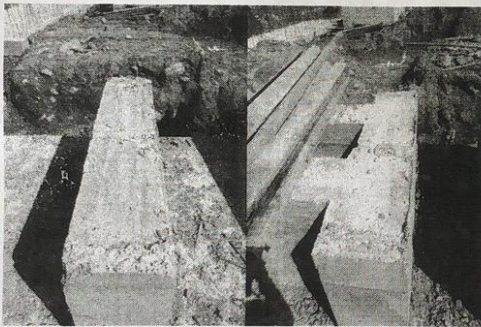

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王全洪

日期: 2018 年 5 月 3 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。
