

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-03




致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于垫层浇筑质量问题整改

内容：

经我方监理对昨日混凝土基础垫层浇筑结果的检查，以及今日现场的垫层浇筑情况的旁站发现存在以下问题，已浇筑的垫层养护不到位存在开裂现象；碎石垫层采用的碎石级配较差杂质较多；因该浇筑区处于回填区位置，按图纸要求，填方区基础底面应采用 400mm 厚的碎石进行换填处理；

该区域垫层未按图纸进行施工、且施工质量较差，现要求贵方对此区域内已浇筑的基础垫层重新进行浇筑施工。望贵方把好施工质量关，严格按照图纸进行施工，如后期再出现此类施工质量问题，将对此分项施工进行停工处理。

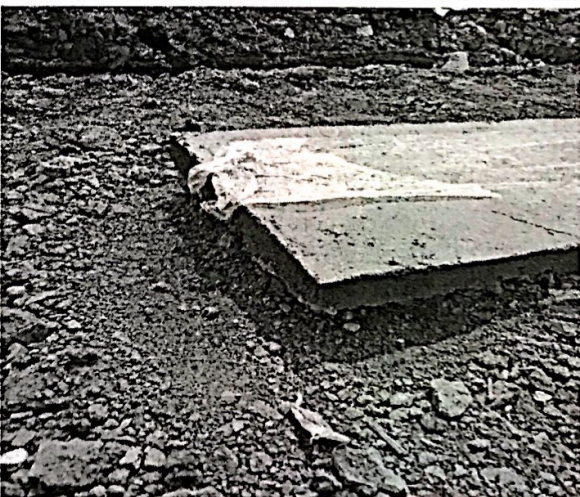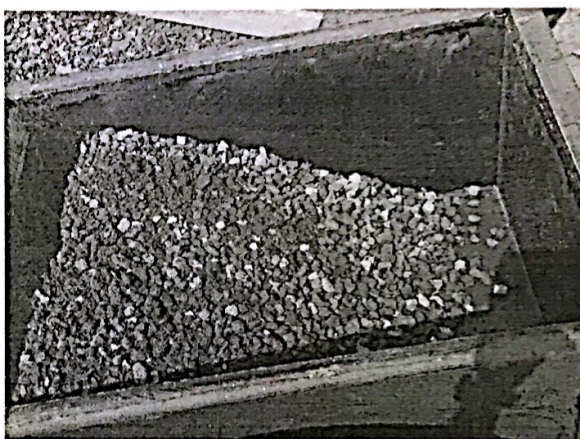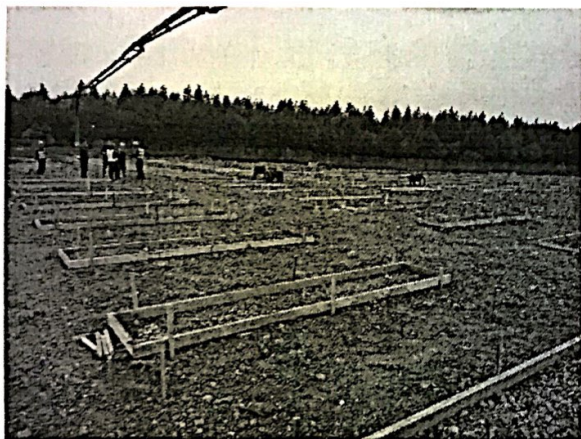

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018 年 05 月 01 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
