

# 监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJB08-17

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于直流电缆套管安装事宜

内容：

通过对一区、二区已安装完成的部分的检查发现，直流电缆套管敷设不在同一水平位置，套管弯曲幅度过大，支架排布不合理，施工工艺较差，严重影响本工程的外观质量。现要求贵方立即对此部分进行整改，更换套管材质，下垂部分增设电缆支架，限期 3 个工作日完成，整改完毕后通知我方监理到场进行验收工作。

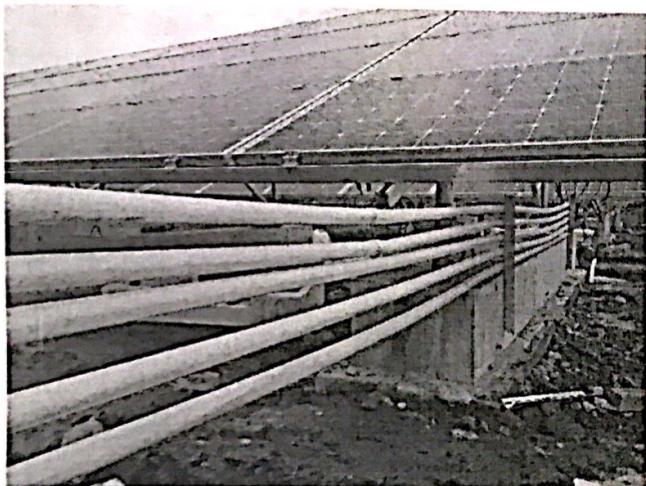

限 1 个工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江永海

日期： 2018 年 06 月 02 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。
