

监理工作通知单

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: GFDZJBM08-20

致: 上海上电电力工程有限公司




事由: 关于并网前现场需整改项事宜

内容

因 6 月 8 日上午 10 点本项目四、五、七区将进行并网工作。通过组建并网前安全质量检查小组, 对明日需并网的三个区现场的安全质量的检查, 发现以下几点问题。

1. 箱式变压器底部的电缆套管过短;
2. 箱式变压器接地线不符合规范要求, 且焊接处未做防腐;
3. 箱式变压器周围无灭火器材, 存在安全隐患;
4. 箱式变压器低压室内有杂物, 废旧电缆丢弃在低压操作室内;
5. 交流汇流箱及逆变器无设备编号, 电缆无线标, 且未有警示牌张贴;
6. 交流汇流箱及逆变器箱体未有可靠接地, 不符箱体防火封堵不到位;
7. 电缆穿管两头未进行封堵施工;



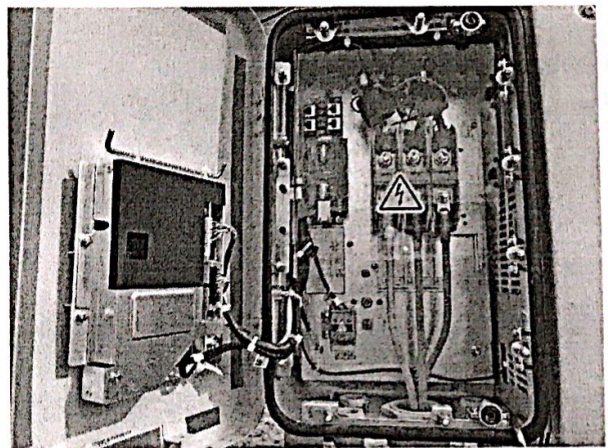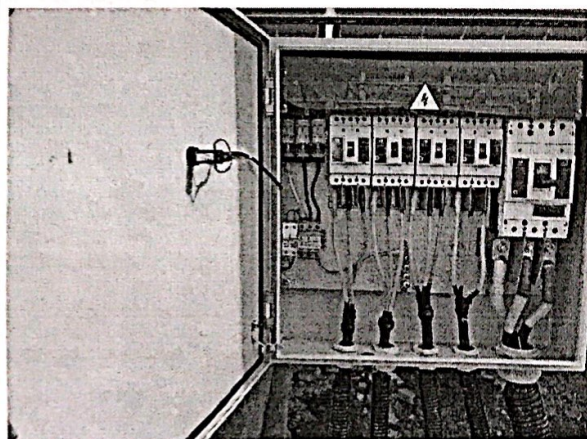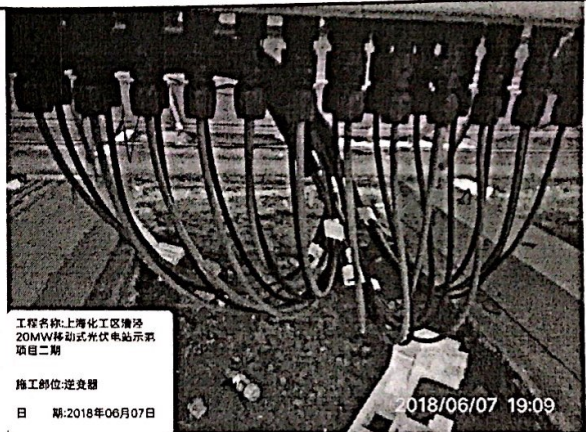

限 1 个 工作日内回复。

特此通知!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张立江

日期: 2018 年 06 月 07 日



本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。
