

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-29

致：上海上电电力工程有限公司


事由：关于东区支架基础浇筑事宜


内容

今日我方监理人员在现场例行检查过程中发现，贵方土建分包班组在 A3 路以西的支架基础施工浇筑质量严重缺失。场区内未先进行排水，垫层表面开裂断裂、缺边角、垫层扭曲变形严重、拆模过早；条基蜂窝麻面、高低不平、偏离中心线、钢筋笼未有保护层。因以上土建施工问题较多且问题严重，现令贵方对不合格的部件予以全部拆除返工，现期 3 日内整改完毕，混凝土浇筑前通知我方监理人员到场进行验收，未经我方人员验收严禁浇筑施工。

望贵方能加强土建分包队伍监管，增派相关土建技术人员到场管理，对施工过程中存在的问题及时予以整改，做好三级自检工作。如后期再出现此类质量问题的出现，将对贵方予以经济处罚并下达停工令。。



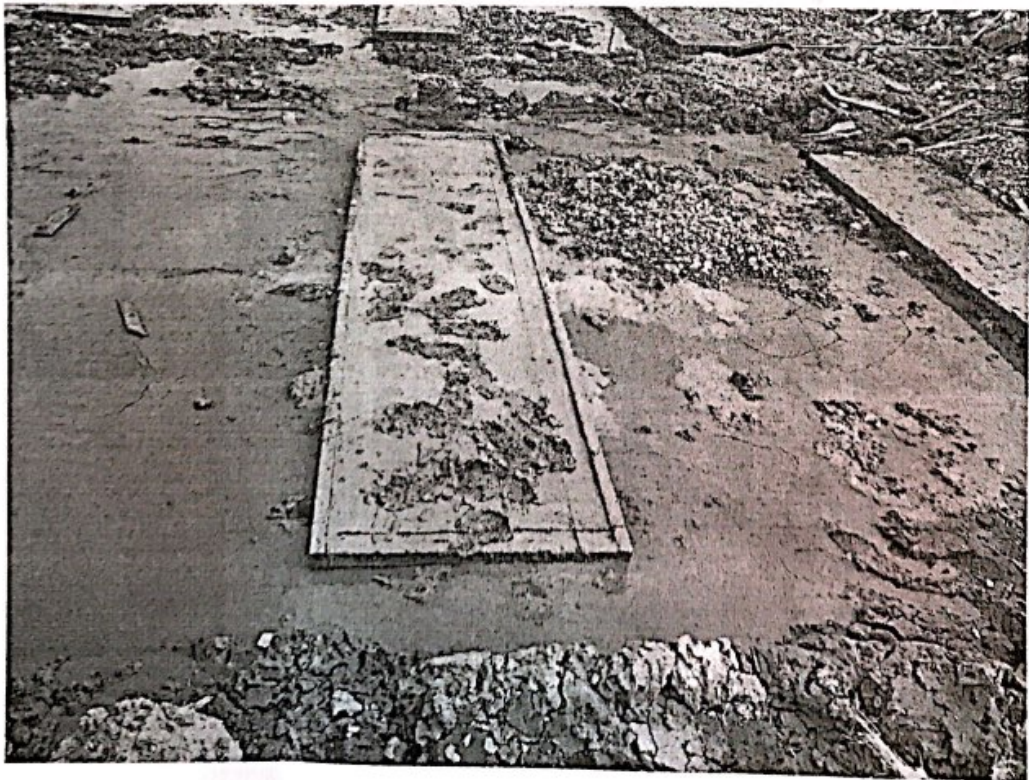

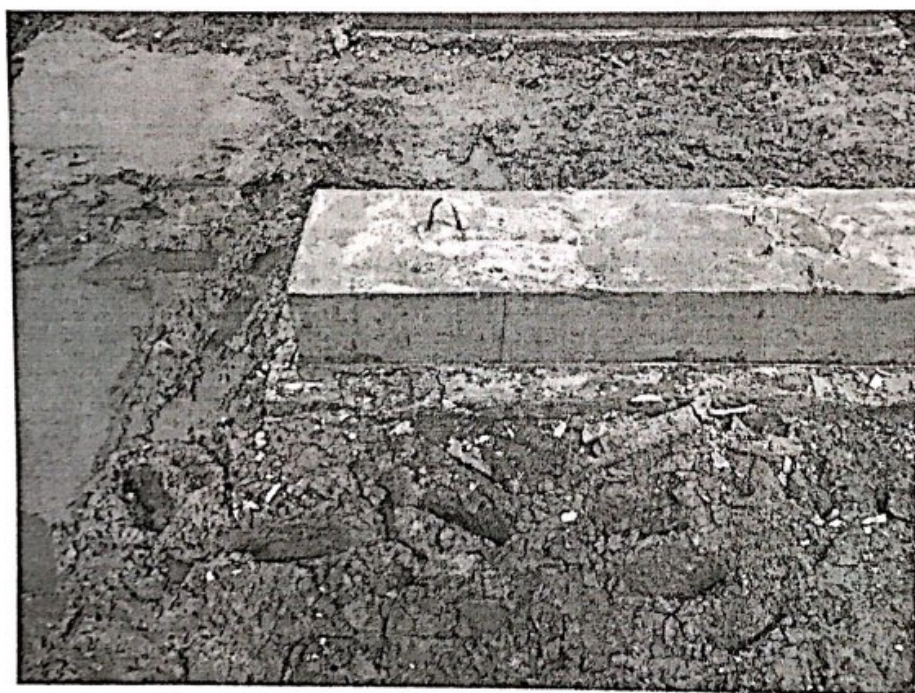

限 1 个 工作日内回复。

特此通知!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 1/3/13

日期: 2018 年 07 月 11 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。
