

监理通知单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号:YCGF-ZHJL-009

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于 110KV 外线安全问题的相关事宜

内容:

贵单位施工的 110KV 外线铁塔组塔完成后, 未经报验验收就擅自开始放线、拉紧施工。我方在巡视检查时发现很多螺栓为单螺母, 双螺母还未紧固, 还存在未放螺母的现象。在螺栓没有紧固前进行放线、拉紧施工, 会对铁塔的质量、安全产生很大影响, 极易出现塔体变形, 出现质量安全事故。现要求你单位立即停止放线、紧固施工, 在螺栓紧固完成, 验收合格后, 再进行下道工序施工。



监理项目部(章)


总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 5 月 30 日


注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

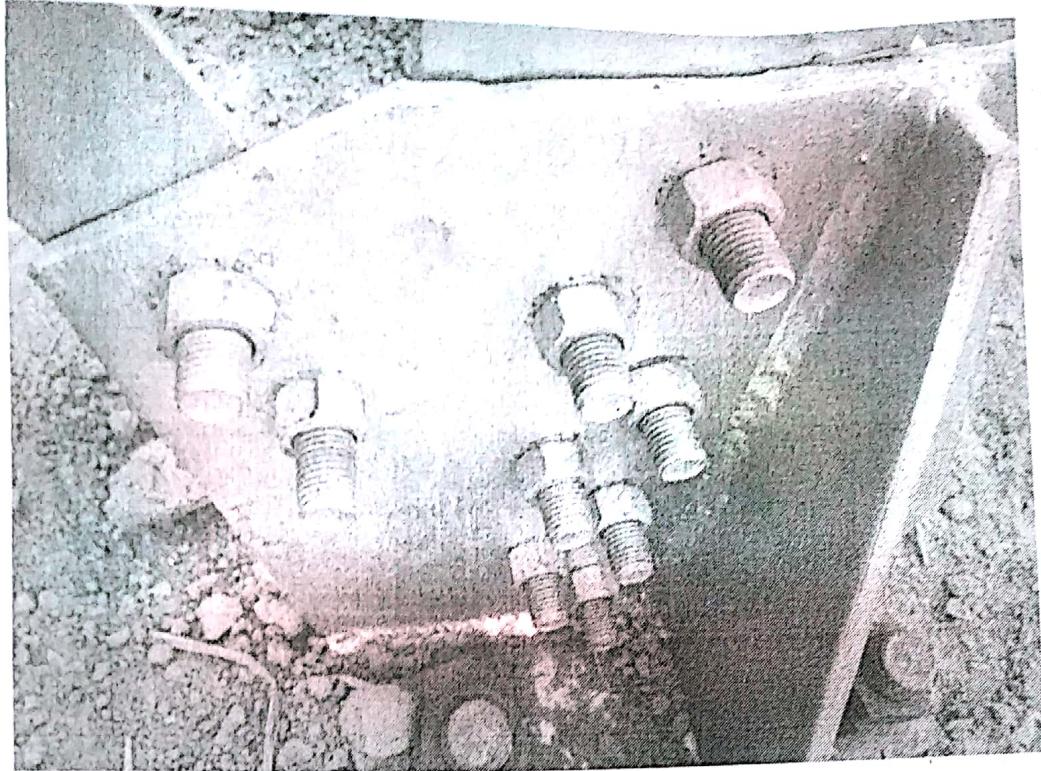

缺少螺栓、垫片并且未紧固

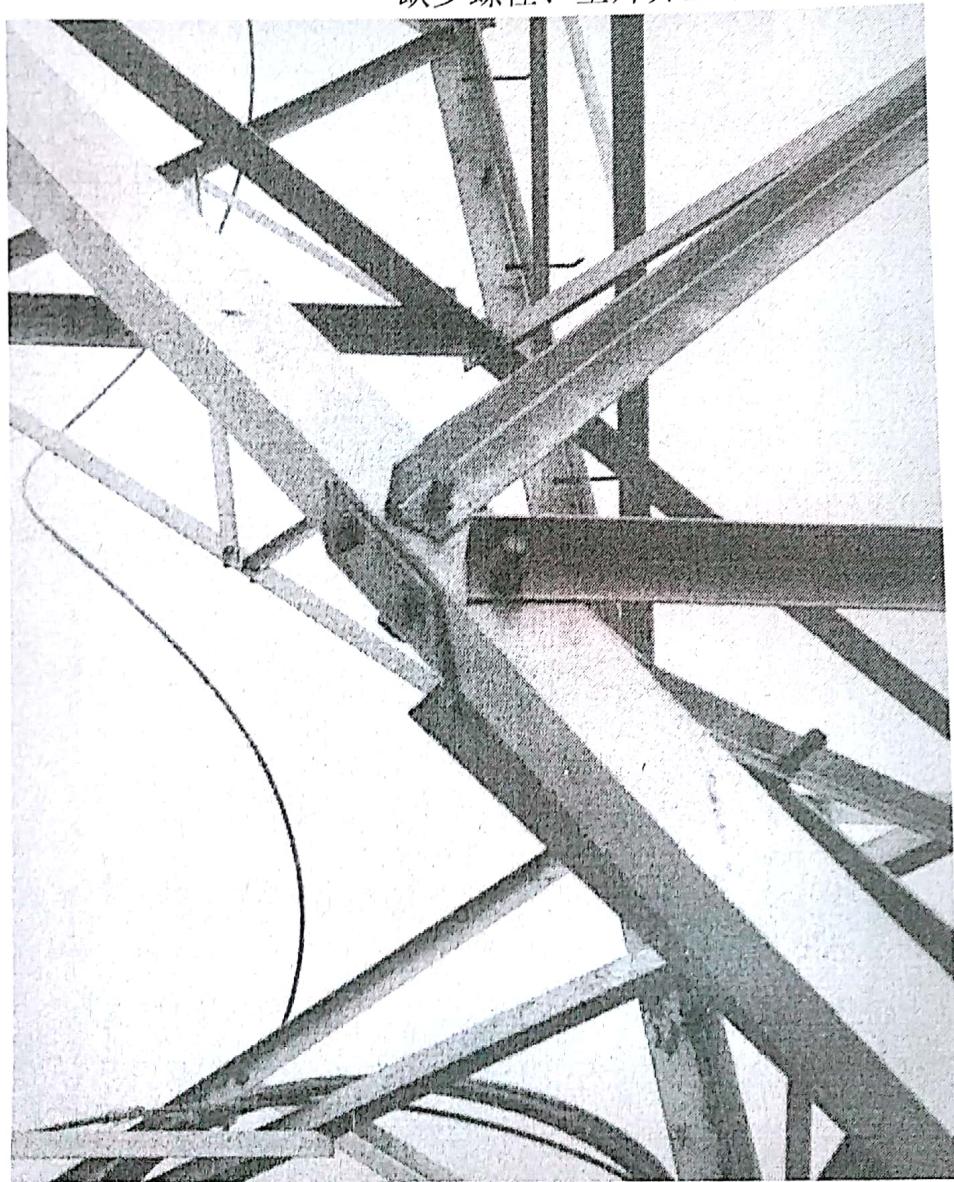

由 扫描全能王 扫描创建
