

监 理 通 知 单

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：GFDZJBM08 -005

致：上海上电电力工程有限公司（项目部）

事由：

关于光伏支架条形基础支墩场地未平整问题

内容：

部分新增的光伏组串条形支墩四周土方未开挖整平，浇注后仍未整平就进行光伏支架安装，未按设计图纸施工（土层下 300mm 土层上 300mm 下图），且未报审监理项目部验收同意，私自进行下道工序施工。。

要求：

总包方项目部对已安装的光伏支架基础支墩周围场地进行人工整平，对未安装的光伏支架支墩与设计图纸不符的要尽快整改，暂停光伏支架、组件安装施工，整改完成后经监理项目部检查验收合格同意后方可进行下道工序施工。施工现场要有技术员与专职安全员在场进行技术指导和安全督查。确保已安装完成的光伏支架、组件完好无损。

附：问题照片及施工图纸

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018年7月6日


注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建




光伏支架安装前前条形支墩情况

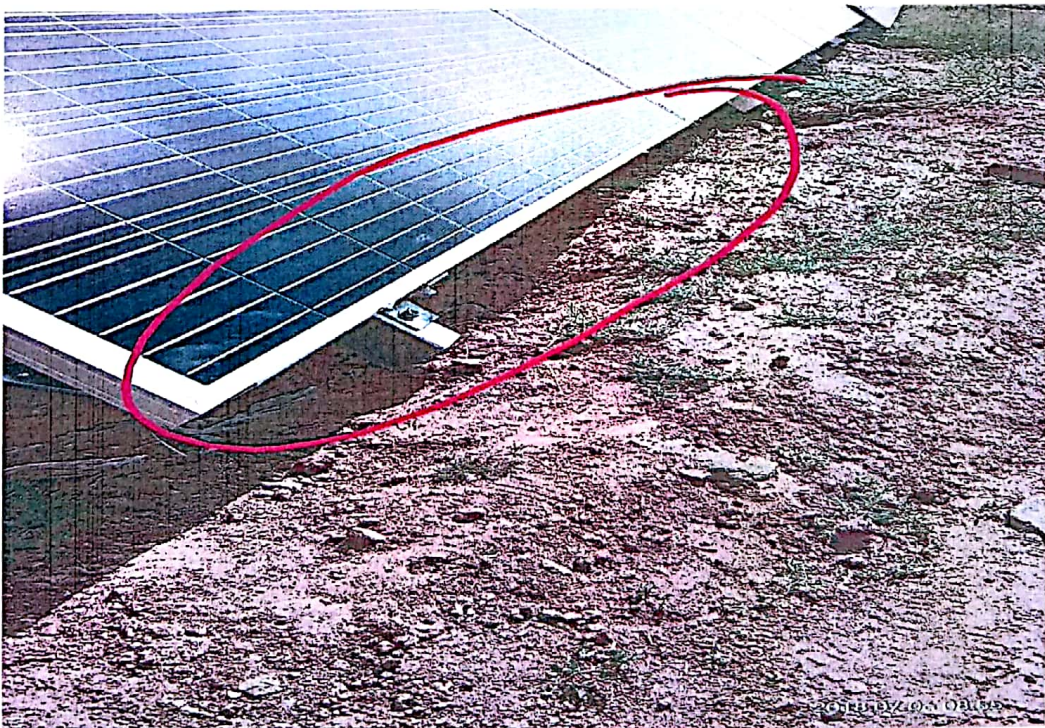

光伏支架、组件安装后



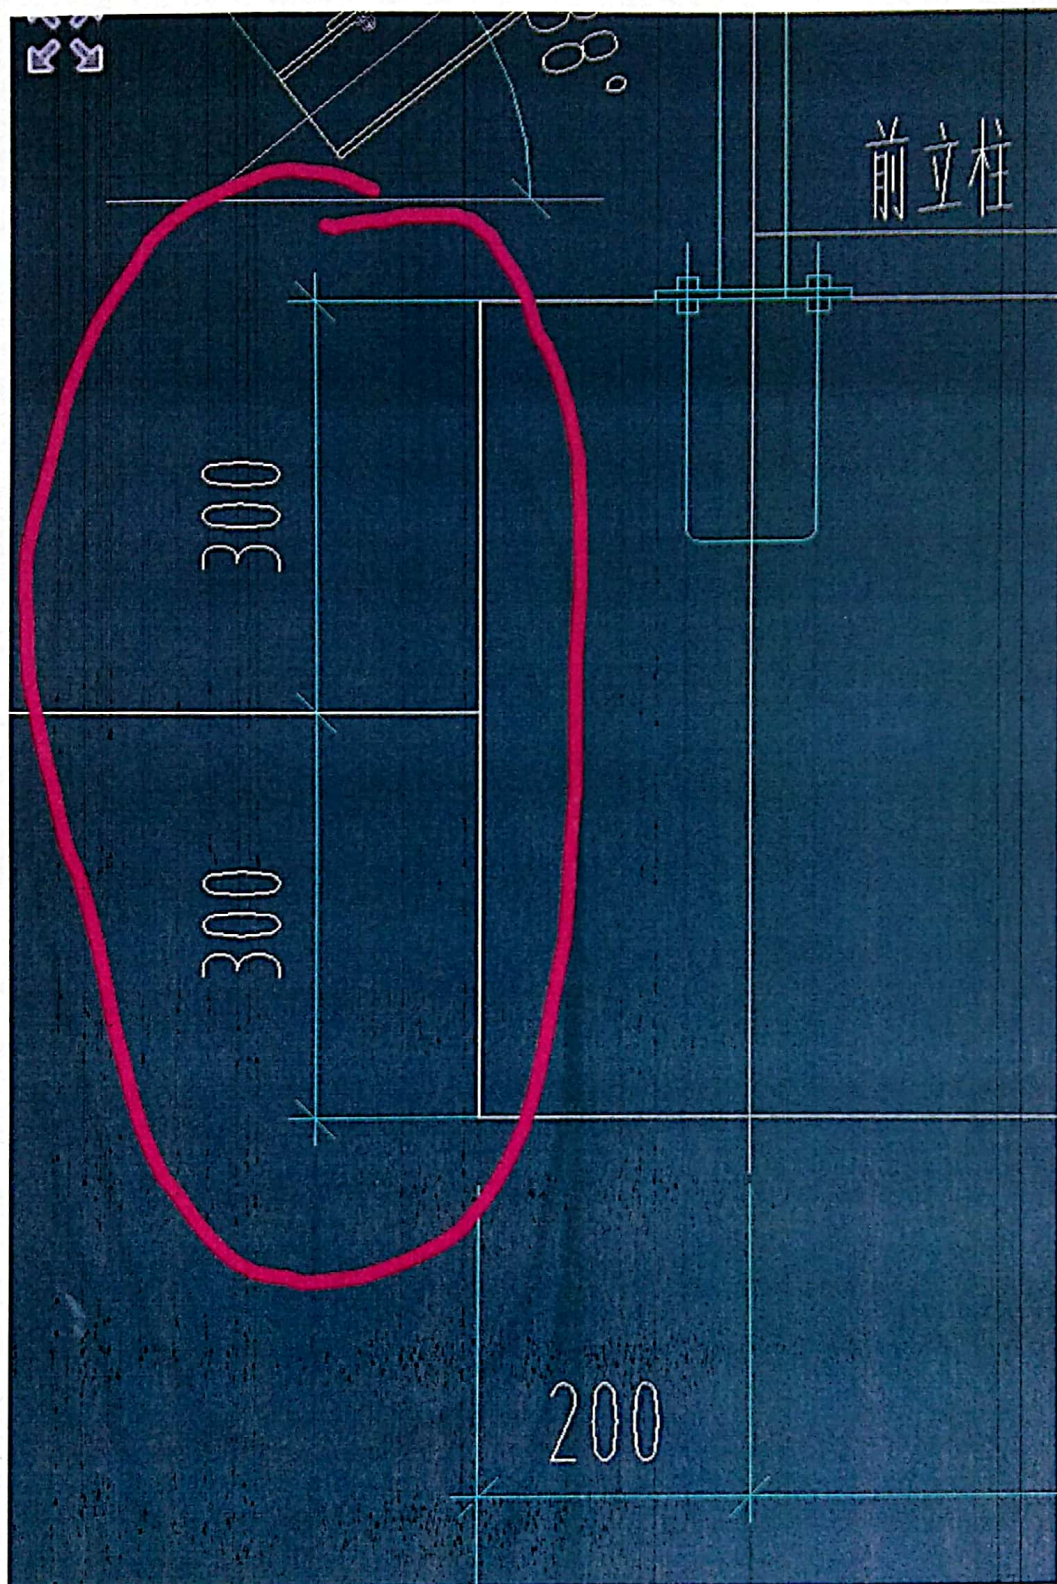

设计图纸

