

JBKXM8

监理通知单


工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-006

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于工程进度事宜

内容：根据建设单位下发《工作联系单（17335-SNCM-BKGL1-015）》的要求，升压站土建交付时间为 2018 年 10 月 30 日，根据目前进度来看本项目工期时间紧、任务重，但监理部在巡视现场发现你单位 13 日-14 日两天综合楼主体均无人施工，严重影响工期目标，现要求你单位项目部高度重视，积极组织人员，机械和材料进场施工，确保进度。

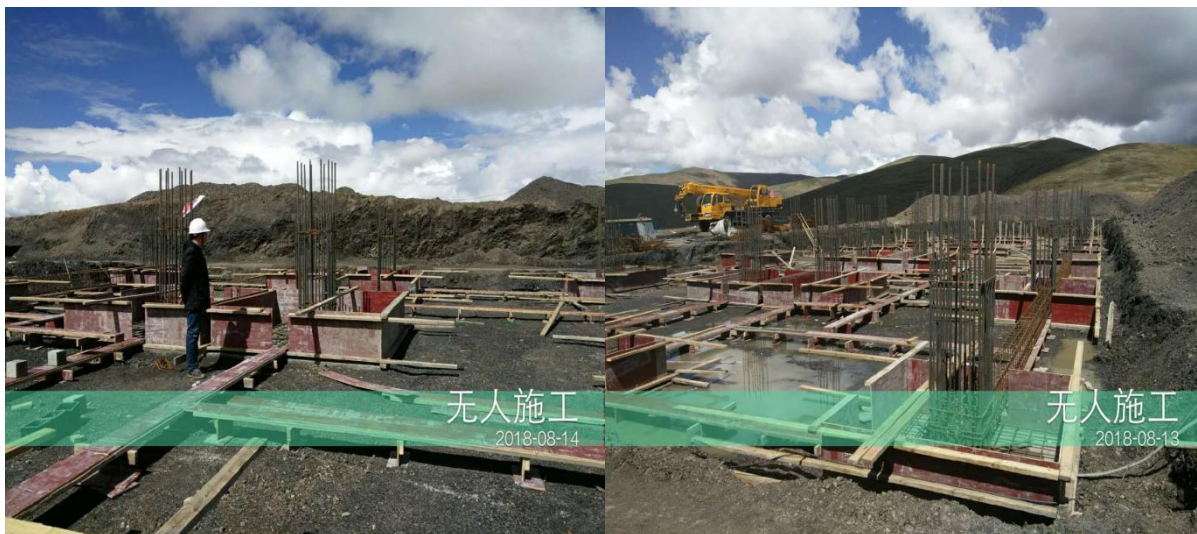

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：保耀生

日期：2018年08月14日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。
