

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-009


致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于升压站综合楼一层排架搭设整改事宜

内容：2018 年 8 月 30 日下午 14:30，在进行现场检查时发现升压站综合楼一层框架排架搭设时存在以下问题：

- 1、未对班组进行技术交底，无方案；
- 2、钢管扣件等材料未报验；
- 3、现场工人特种作业证未提供；
- 4、部分横杆长度不足；
- 5、部分扫地杆离地高度超过规定的 200mm；
- 6、垫板部分地方悬空；

以上问题要求你单位项目部立即进行整改，限 2018 年 9 月 2 日前整改完成并回复，验收合格前不得进行顶板安装。

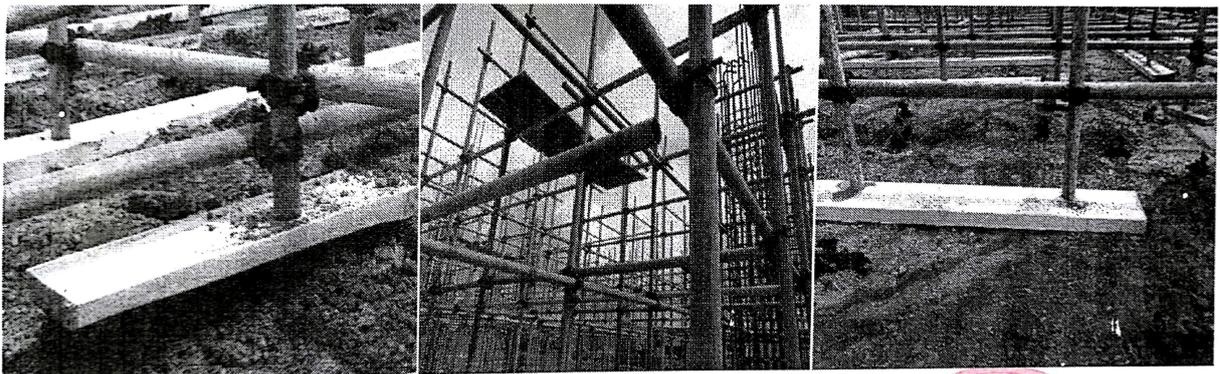

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 8 月 31 日

措美北控监理项目部

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
