

监 理 通 知 单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号：ZJL-015

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由：关于组件安装及接地焊接的问题

内容：你单位承包施工的《2018年房县光伏扶贫项目》一标段工程：

近期我监理方验收光伏组件时，发现以下问题：

1、1#、2#、3#地组件安装有边压、中压未安装到位，与组件之间缝隙过大，不能有效的固定光伏组件。（附图）

2、1#、2#地组件安装有部分边压、中压未安装弹垫。（附图）

3、1#、2#、3#地组件安装有部分边压、中压螺丝未紧固到位。（附图）

4、组件安装边压紧固位置边距应达到8-12公分，有个别边压未达到要求。（附图）

5、1#地光伏组件有边压未安装的情况（附图）。

6、1#地个别接地极未焊接。（附图）

以上问题要求你方尽快整改，并将整改结果以回复通知单的形式回复我方，并进行复验。

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部：

总/专业监理工程师：孔令波

2018年房县光伏扶贫项目监理部

监理项目部


日 期：2018年09月22日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。


1、边（中）压未安装到位




2、边（中）压块未安装弹垫

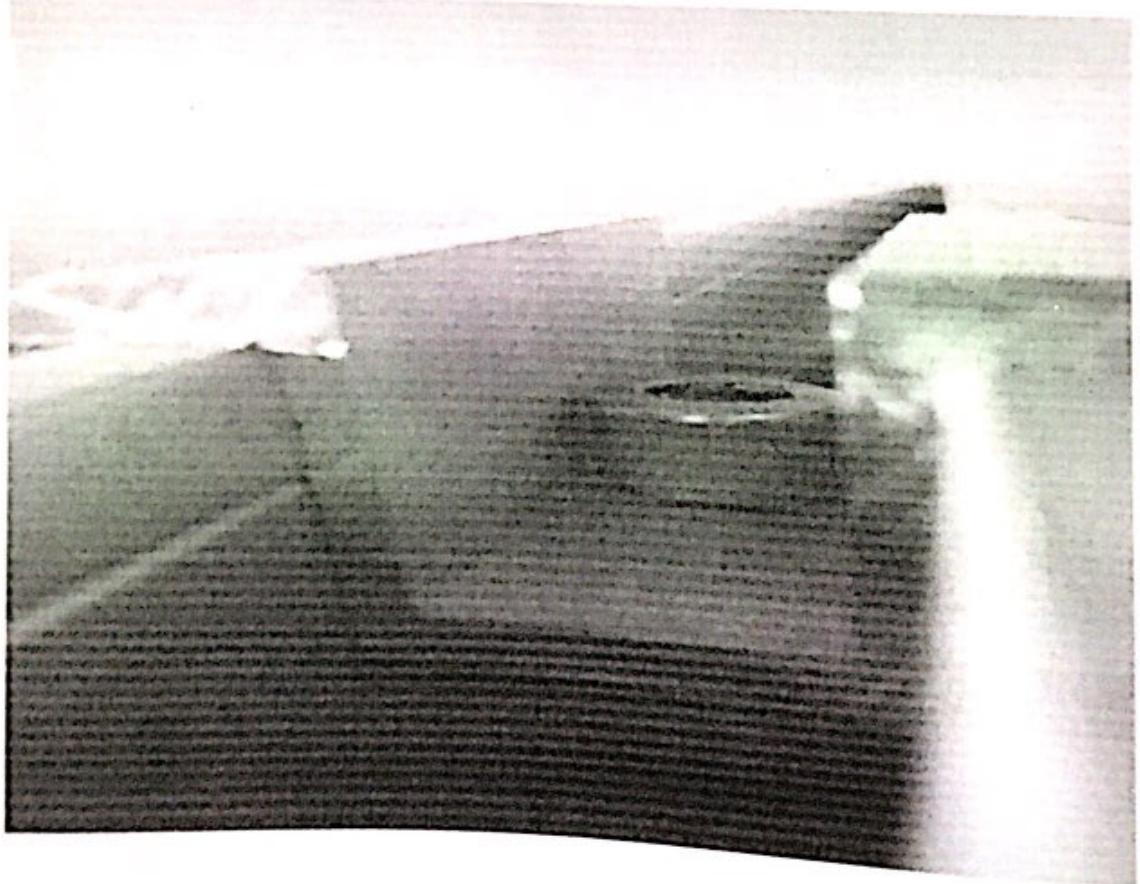


3、压块螺丝未紧固

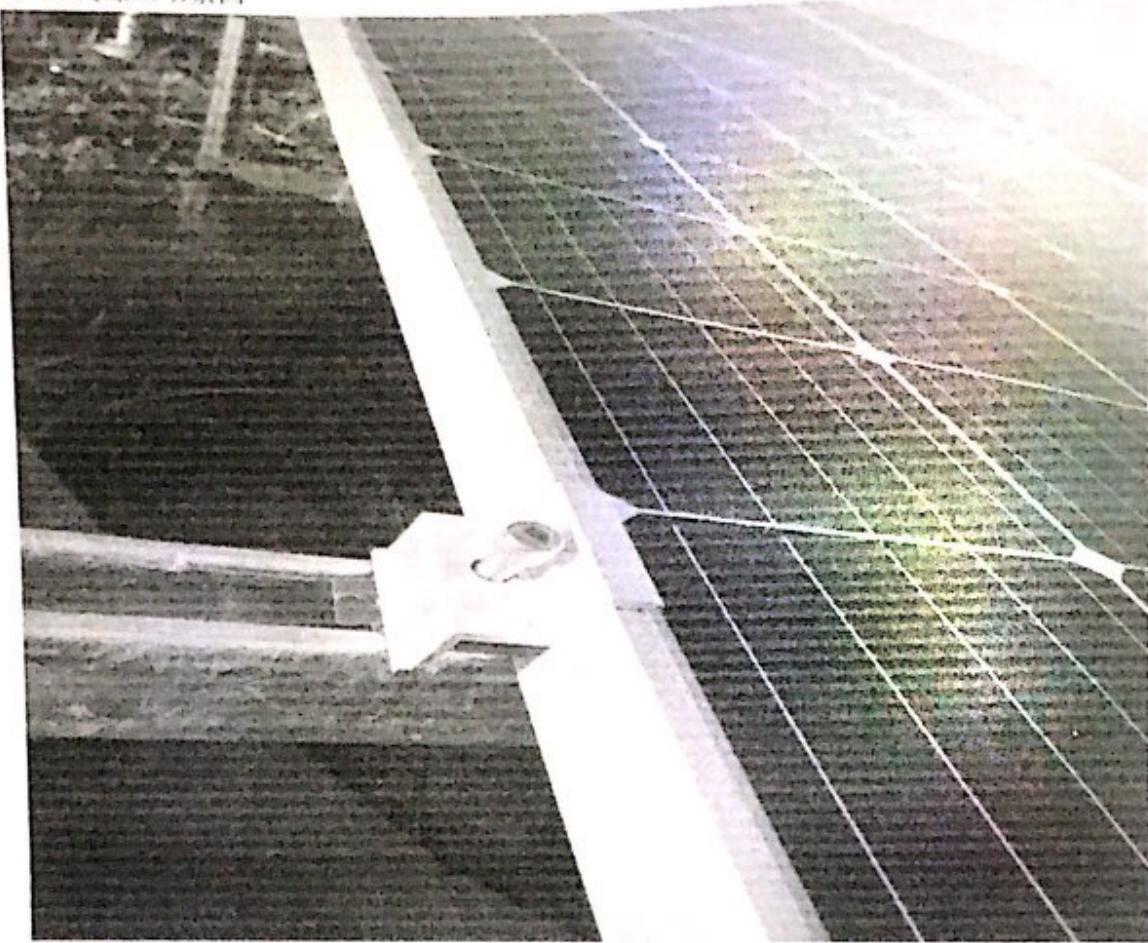

4、边压块边距不够

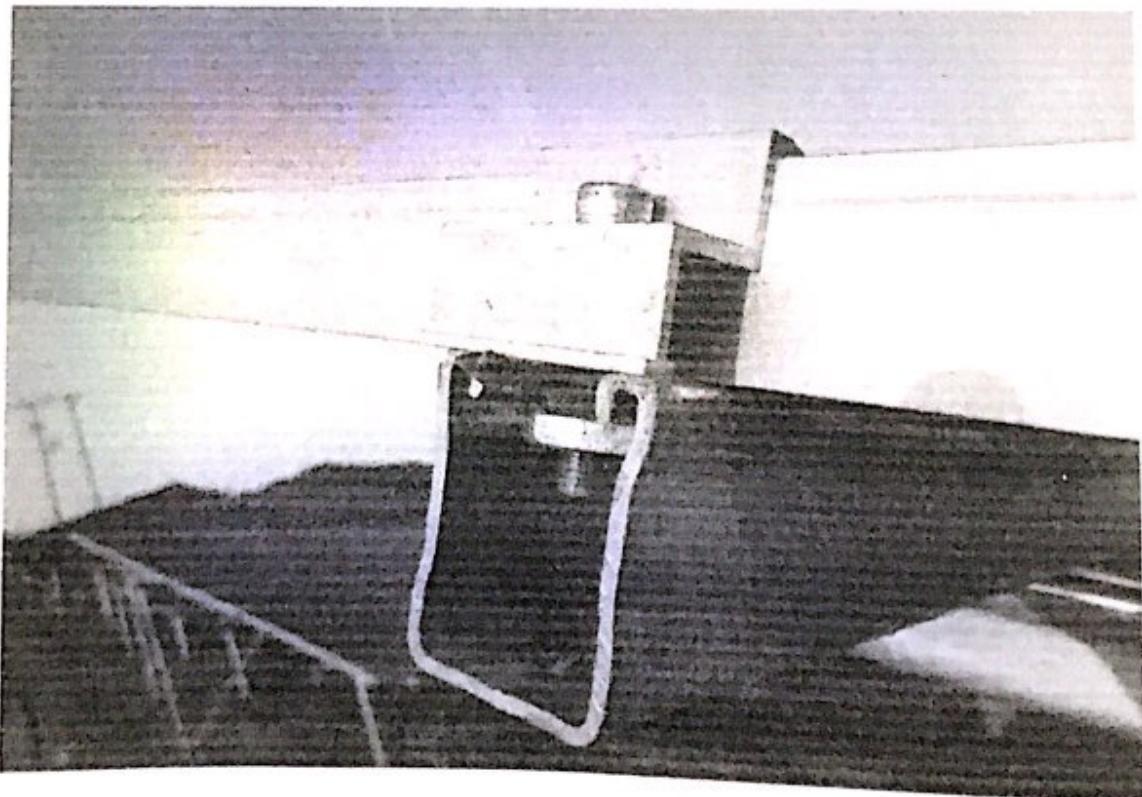

5、边压块漏安装

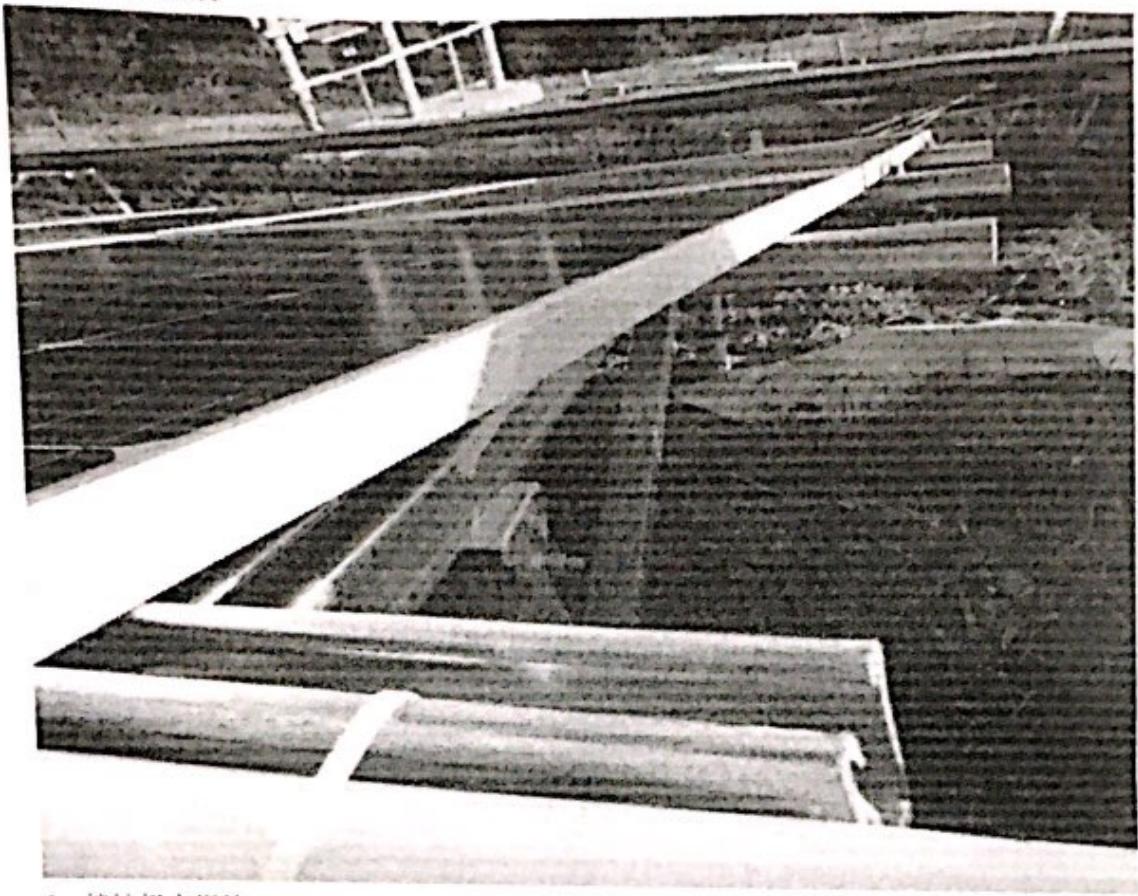

6、接地极未焊接

