

部分现场问题汇总

1. 电站综合性能检测报告未提供至各单位
2. 箱变围栏基础松动



3. 设备基础接地扁铁、壳体因施工原因造成生锈现象





4. 设备基础接地扁铁埋至深度过浅，且
外 露 地 表






5.各箱变设备防火封堵不到位，且防火
泥 严 重 脱 落





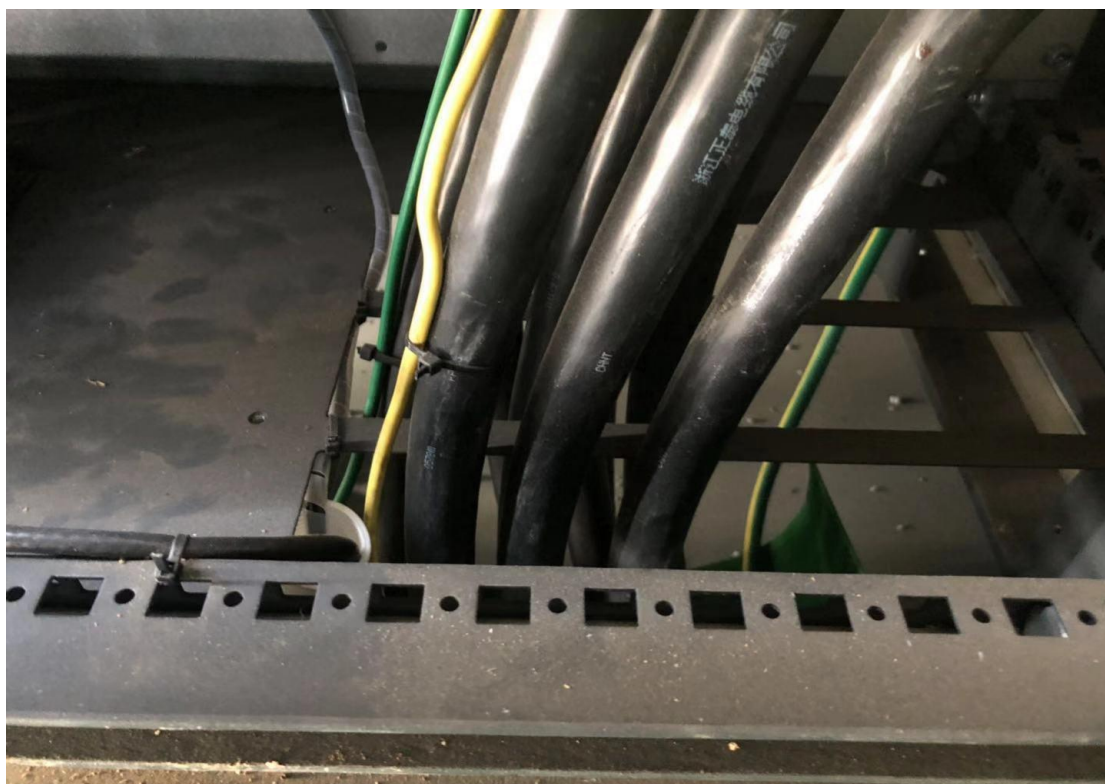


6.箱变 1#、2#、5#基础存在积水，且 1#、5#抽水泵不工作（不工作情况请检查好，避免验收中再次出现）






7.485 通讯线接入未整理完善好

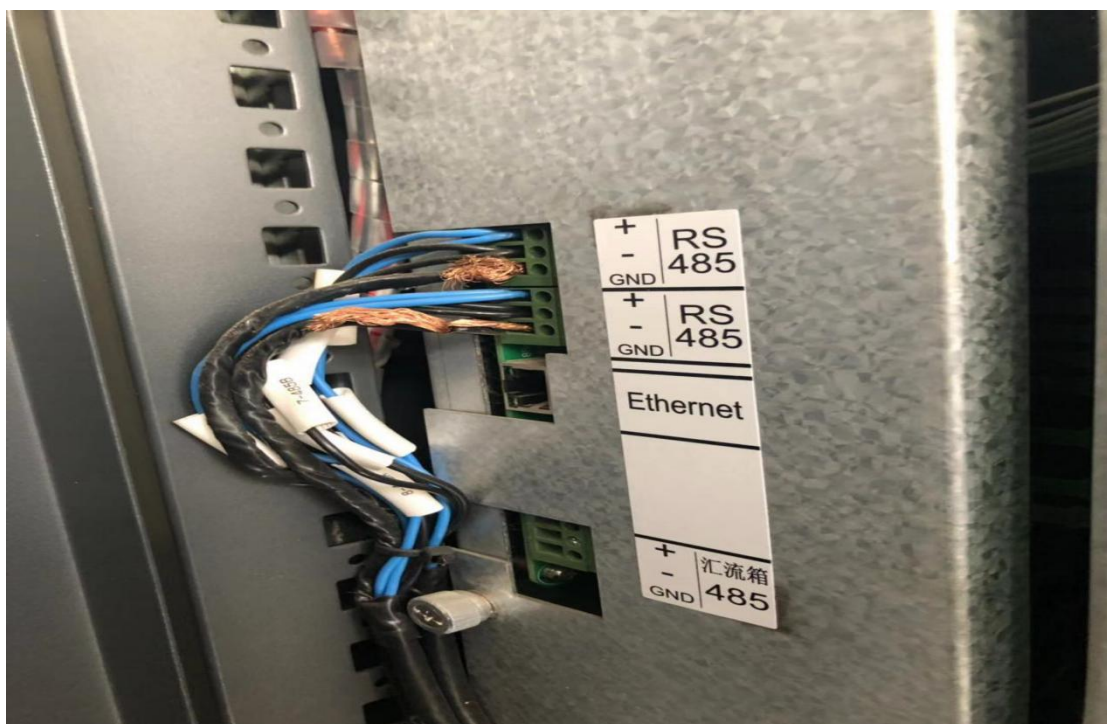

8.基础内抽水泵电源线接入不规范，且基坑内电线雨水天气极易造成漏电现象、排出水管未降低高度，裸露地表，易造成老化损坏

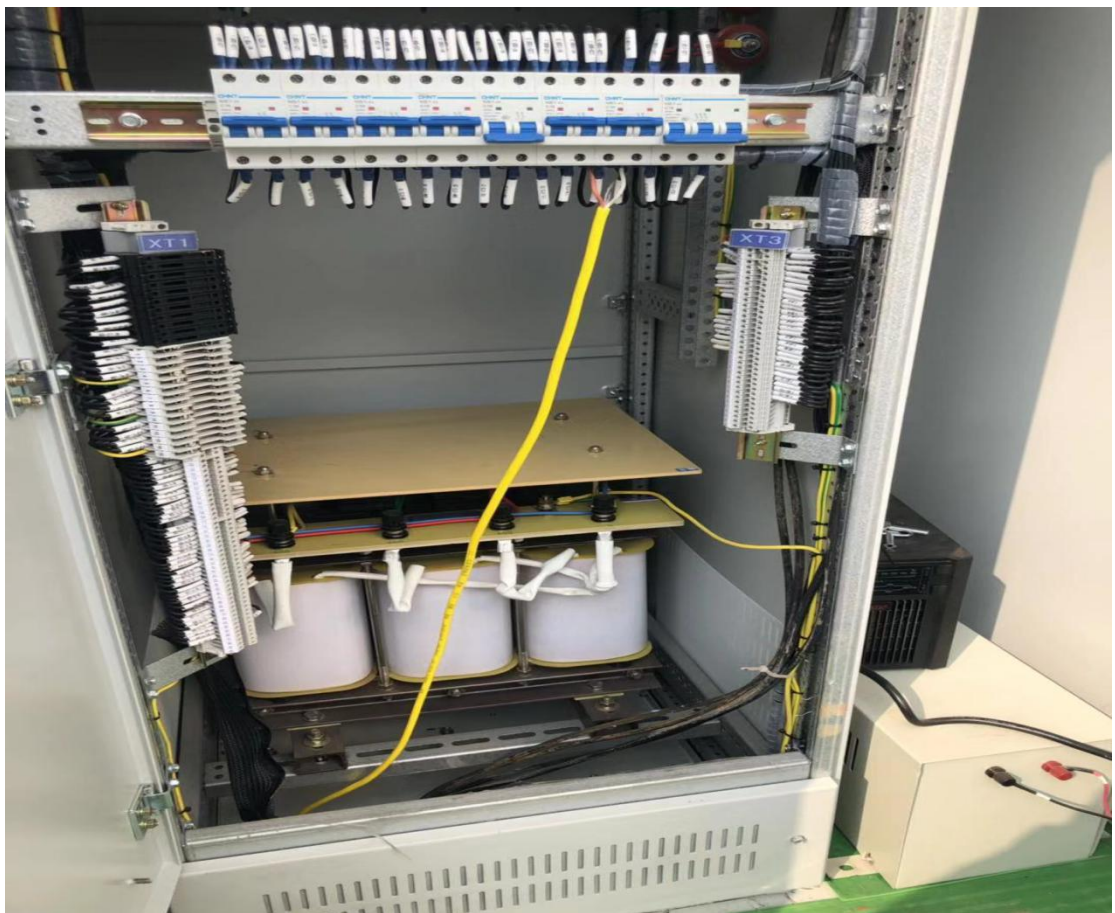



9. 屋面接地扁铁镀锌层厚度不符合要求，
已 开 裂 脱 落





10. 屋面接地扁铁、接地钻孔、夹具、
抱箍等生锈






11. 直流线缆部分未绑扎好



12. 清洗系统，管内水未抽排出去且保温材料脱落



13. 各设备舱门只存在一边上锁，且还存在未上锁现象

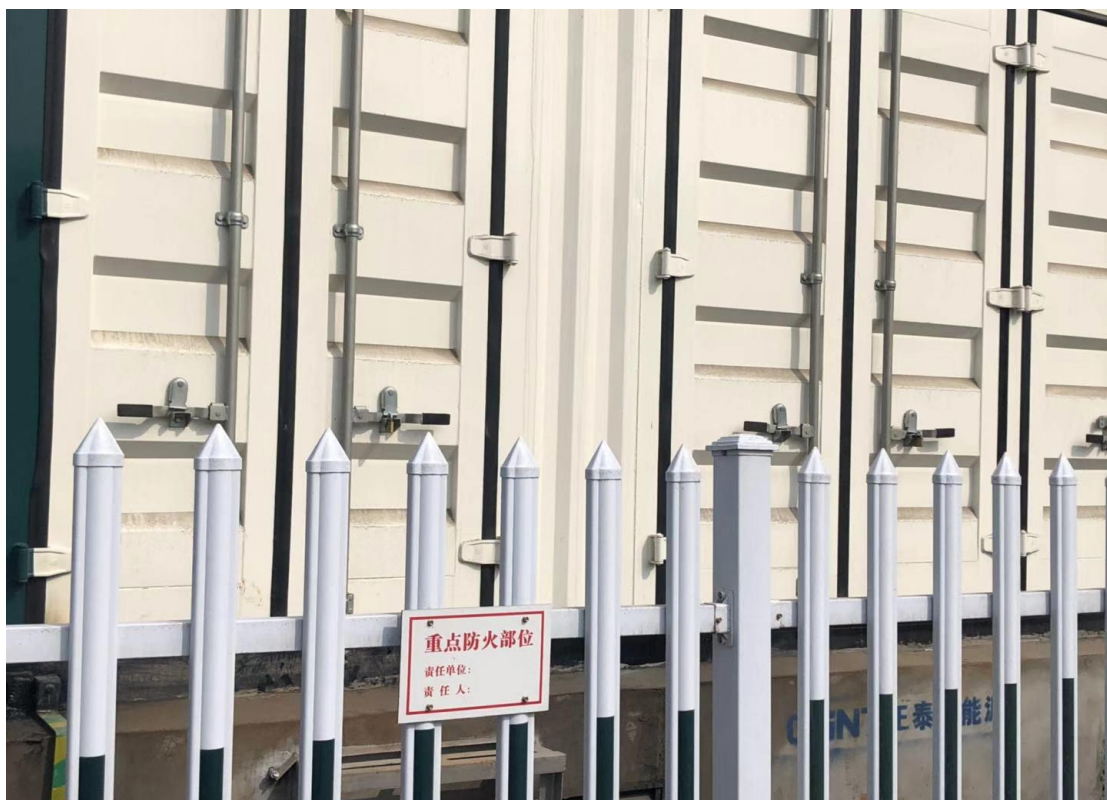



14. 各设备已带电，一次仓内电气柜还存在未上锁紧固现象



15. 对箱变参数故障及时联系厂家处理好

16. 项目工程资料请按照NB/T32037-2017《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》要求整理完成（具体目录清单可参阅规范及建设单位提供清单）

17. 请抓紧落实以上问题整改，同时加强现场巡视检查，对屋面围挡、易掉落物品检查，加强各设备运行情况检查

注：本次检查只进行部分设备及废料车间屋面巡视检查，各汇流箱、桥架内线缆均未进行检查，以上问题只是局部现象，整改需从整个现场（安装、电气、土建、设备）进行整改
