

监 理 通 知 单

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004


致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于现场支架底座与基础螺栓不匹配事宜。

内容：该项目经过你方与支架厂家协商后，目前又一次因厂家将支架底座型号搞错材料错发导致不能进行施工，已严重影响工程进度计划。

要求：

现要求你方立即制定可行的计划方案进行补救，并向我方与建设单位进行回复。

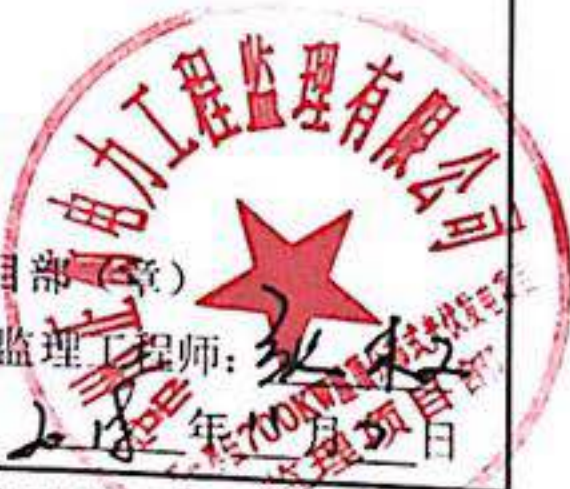

监理项目部(章)
总/专业监理工程师：张永
日期：2018年10月25日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB14-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-004 的监理通知后, 已按要求完成了 可行的计划方案 工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 整改方案



监理项目部复查意见:

符合要求



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

关于苏州赛伍光伏项目三孔底座的可行的计划方案

致苏州赛伍光伏发电项目监理项目部：

现场于 2018 年 11 月 5 日下午 6 时到货的三孔底座进行验货，发现三孔底座开孔的尺寸和条基的预埋件有所偏差(约 1mm 的误差)。项目部立刻向相关领导汇报并与支架厂家技术负责人联系。

厂家回复：因车床的刀具使用时间较长，出现刀具的磨损，导致开孔的尺寸有偏差。

厂家给与的解决方案：

- 1、11 月 6 日早上加派两个工人（共 4 人）使用钻孔机在现场对三孔底座整改（扩孔处理，并提供扩孔后的产品质保书），限时 1 天；
- 2、对扩孔后的三孔底座进行漆面修复（一层底漆、一层防锈漆、一层镀锌漆），以确保三孔底座的质量和使用寿命。

项目部定会加强管理，并吸取本次教训。

特此报告。

安徽福慧多电气有限公司苏州赛伍光伏项目项目部

2018 年 11 月 4 日

项目部
